

Váš dopis zn. -/-
Ze dne -
Naše zn. 70021/2023-SŽ-GŘ-O12
Listů/příloh 84/5

Vyřizuje Ing. Hana Rejhon
Telefon +420 972 325 457
Mobil +420 601 385 020
E-mail rejhonh@spravazeleznic.cz
Datum 11.10.2023

- dle rozdělovníku (viz příloha č. 1)

Zápis z celostátní měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce listopad, prosinec 2023 a leden 2024

Dne 27.09.2023 proběhla v Praze celostátní měsíční výluková porada Správy železnic, státní organizace za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy. Zápis z porady je přílohou č. 2.

Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel odboru operativního řízení provozu a výluk

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozdělovník
- Příloha č. 2 – Zápis z porady
- Příloha č. 3 – Změnové tabulky listopad a prosinec 2023
- Příloha č. 4 – Prezentace DB NETZE – zřízení dispečerského pracoviště
- Příloha č. 5 – Prezenční listina

Tento dokument je distribuován pouze elektronickou cestou.

Příloha č. 1 Rozdělovník

Správa železnic, státní organizace:

- O12, O15, O16, CDP Praha, CDP Přerov
- OŘ – Ostrava, Brno, Hradec Králové, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň
- Stavební správa východ
- Stavební správa západ
- CTD
- SŽT

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře:

- Předseda Úřadu yhygbyn

Objednavatelé dopravy:

- **Ministerstvo dopravy ČR** n75aau3
- **Krajský úřad:**
 - Jihočeského kraje kdib3rr
 - Jihomoravského kraje x2pbqzq
 - Karlovarského kraje siqbx2
 - Kraje Vysočina ksab3eu
 - Královéhradeckého kraje gcg3p3q
 - Libereckého kraje c5kbvkw
 - Moravskoslezského kraje 8x6bxsd
 - Olomouckého kraje qiabfmf
 - Pardubického kraje z28bwu9
 - Plzeňského kraje zzjbr3p
 - Středočeského kraje keebyyf
 - Ústeckého kraje t9zbsva
 - Zlínského kraje scsbwku
 - Magistrát hlavního města Prahy 48ia97h
- KORIDLK spol. s r. o. 3gpgib2
- KIDSOK, p. o. idz9c2j
- KOVED, s. r. o. bv4gfwe
- KODIS, s. r. o. 24tgfvk
- KORDIS JMK, a. s. gwpghss
- JIKORD, s. r. o. pw7jc78
- IDOK, p. o. apjkk4k
- IDSK, p. o. pdrwknv
- OREDO, s. r. o. dinrnxn
- POVED, s. r. o. 4xwp5cq
- ROPID, p. o. ku79q7n

Dopravci:

- ARRIVA vlaky, s. r. o. ry8jzpd
- AŽD Praha, s. r. o. z77cc7s
- BF Logistics, s. r. o. dutrj5j
- Cargo Motion, s. r. o. c4xnxah
- CER Slovakia, a. s. wu94xs7
- CityRail, a. s. vfs8fhd
- CZ Logistics, s. r. o. azyw6ds

- ČD Cargo, a. s.	8tscdpq
- ČESKÁ ZÁPADNÍ DRÁHA, s. r. o.	t23zxd5
- České dráhy, a. s.	e52cdsf
- Die Länderbahn CZ, s. r. o.	h289khv
- DB Cargo Czechia, s. r. o.	4pwwhkw
- DBV-ITL, s. r. o.	nqex9sj
- DRAKEM, s. r. o.	ptnzsg3
- EDIKT, a. s.	p8ncd8g
- E-Railconstruct, s. r. o.	xsxg4ar
- Elektrizace železnic Praha, a. s.	eaedvez
- EP Cargo, a. s.	j7jtgvd
- EUROVIA CS, a. s.	bjpgdza
- European Train Transport and Service, s. r. o.	qiagn23
- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.	j8pd5dg
- Gepard Express, SE	23w3t8a
- Gerhát Train, s. r. o.	nn2fmpx
- GJW Praha spol. s r. o.	kbhubva
- GW Cargo s.r.o.	dwcra8z
- GW Train Regio, a. s.	inkgway
- Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.	rwtrksq
- HROCHOSTROJ, a. s.	jgtigv7
- HSL – Logistik, s. r. o.	fqu9yig
- Hroší stavby Morava, a. s.	ncwjmnh
- Chládek & Tintěra, a. s.	zvin7tc
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.	vcddec2
- Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.	55ndecw
- IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.	wvcehcj
- IDS CARGO, a. s.	7nmehj9
- IDS LocoCare, s. r. o.	vr7ftn9
- JARO Česká Skalice, s. r. o.	344djbh
- KK - provoz a opravy lok., s. r. o.	ddvfsmw
- KŽC Doprava, s. r. o.	iv6he4q
- Leo Express, s. r. o.	qbiwget
- Leo Express Global, a. s.	5r2izx7
- Leo Express Tenders, s. r. o.	7k425eb
- Lokálka Group, spolek	azbizcf
- LokoTrain, s. r. o.	3j8i2hc
- LOKO TRANS, s. r. o.	529izfe
- LOKOTRANS SERVIS, s. r. o.	k6sizi
- LTE Logistik a Transport Czechia, s. r. o.	bwzi7fi
- MBM rail, s. r. o.	ukjji92
- METRANS, a. s.	3nprdab
- METRANS Rail, s. r. o.	ttsr5ad
- MS-railway, s. r. o.	cvp8rgu
- N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.	mxjqdw3
- NOR, a. s.	5svferf
- ORLEN Unipetrol Doprava, s. r. o.	upm88qu
- OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ, s. r. o.	asdrb8a
- Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	6hi88ts
- PDV RAILWAY, a. s.	ht5cd2d
- PESTA dopravní stavby, s. r. o.	i93vs8n
- Pirell CZ, s. r. o.	8z5xie7
- PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s.	gv4cgeh
- Puš, s. r. o.	wd8r4fg
- Rabbit Rail, s. r. o.	8x5jy2d
- Rail Cargo Carrier - Czech Republic, s. r. o.	cz8tc7t
- RailLog, s. r. o.	q4ijrry
- Rail systém, s. r. o.	gi34itt

- Railway Capital, a. s.	c9d5mdw
- RegioJet, a. s.	285fzhb
- RegioJet ÚK, a. s.	iidmjms
- REKOP, s. r. o.	7kfw3jy
- Retrack Czech, s. r. o.	iq8k69r
- RETROLOK, s. r. o.	shpzt92
- ReViRail CZ, s. r. o.	s2msjky
- RM LINES, a. s.	9w9f3zh
- RUTR, spol. s r. o.	3acyiqw
- SART-stavby a rekonstrukce, a. s.	fe5f7j9
- SD - Kolejová doprava, a. s.	x77f79p
- Skanska, a. s.	d7zgbd2
- SEŽEV-REKO, a. s.	a9pf9sk
- Slezské zemské dráhy, o. p. s.	dr9kwvt
- SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA, a. s.	qccshx3
- Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s.	n7b2aw8
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.	mz4chhv
- STRABAG Rail, a. s.	9vbgv95
- S u b t e r r a, a. s.	jxtcg8w
- TOMI-REMONT, a. s.	h3gch66
- TRAIL Servis, a. s.	tfvgwau
- TrainGo, s. r. o.	rjzw45q
- TRAMO RAIL, a. s.	7f2gqrj
- Trans Rapid, s. r. o.	hbby6uv
- Transport line Cargo, s. r. o.	pzi6cit
- Traťová strojní společnost, a. s.	ucysdk6
- TSS Cargo, a. s.	hv58e59
- TSS GRADE, a. s.	6u9e9a3
- VIAMONT Servis, a. s.	tfvgwau
- VÍTKOVICE Doprava, a. s.	5qbcifu
- Výzkumný Ústav Železniční, a. s.	m37gziu
- ZABABA, s. r. o.	zjvcitx
- Železničné stavby, a. s. Košice	7xj5jyc
- SWIETELSKY Rail CZ, s. r. o.	zun5p2d
- BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.	miklos@btslovakia.sk
- European Train Transport and Service, s. r. o.	gabrysova@etts.cz
- Die Länderbahn GmbH DLB	michal.bartak@laenderbahn.com
- LOKORAIL, a. s.	carrera@lokorail.sk
- LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- MH - spedition, s. r. o.	dtrnka@interport.sk
- PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	p.budacz@pkp-cargo.eu
- Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť	dispecer@psz.sk
- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOLEJOWYCH KOLPREM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Grzegorz.Supernak@arcelormittal.com
- Railtrans International, s. r. o.	kuruc@railtrans.eu
- S-Rail CZ, s. r. o.	peter.kiss@s-rail.cz
- Retrack Slovakia, s. r. o.	peter.mlyncek@vtg.com
- RTS Rail Transport Service GmbH	michal.tocev@rts-rail.com
- TORAMOS, s. r. o.	stanislav.bolek@toramos.cz
- VIALTE, s. r. o.	michal.lovisek@lte-group.eu
- Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH	info@mchytal.cz
- Zug agency, s. r. o.	horvath@zugagency.cz

Zájmová sdružení v dopravě:

- Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, z. s. mshgutn
- Svaz osobních železničních dopravců, z. s. xpdfmzk

Zápis z jednání

Zápis z měsíční výlukové porady pro tvorbu střednědobých plánů výluk na měsíce listopad, prosinec 2023 a leden 2024

Datum konání 27.09.2023
Čas 10:00 – 13:00
Zapsala Ing. Hana Rejhon
Přítomni viz Prezenční listina

Program:

1. Úvod
2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+
3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě důležitých staveb
4. Projednání výluk nad rámec RPV – leden 2024
5. Projednání změn MP – listopad 2023
6. Projednání změn SUP – prosinec 2023
7. Projednání změn SP – leden 2024
8. Různé
9. Závěr

1. Úvod

Poradu zahájil Ř O12 Ing. Tomáš Rolník, MBA, který přivítal zúčastněné a:

- Omluvil VO O12/2 p. Jiřího Nováka, který se z důvodu čerpání řádné dovolené nemohl dané porady zúčastnit.
- Informoval o výsledku prověření úkolu z minulé celostátní výlukové porady v rámci, které bylo slíbeno prověřit aktivaci ETCS na VR 501 v průběhu roku 2024. V současné době je na Portále provozování dráhy v sekci Provozování dráhy a Mapy vyvěšena mapa výluk ETCS. Do této sekce bude nově vložena mapa zobrazující postupnou aktivaci ETCS v roce 2024. V současné době se daná mapa zpracovává příslušnými odbornými složkami Správy železnic, státní organizace.
- Dále informoval o aktuální situaci a četných změnách na stavbách, ke kterým dochází i z důvodu prodlužování procesů uzavírání smluv se zhotoviteli. Jako příklad zmínil stavbu Vlkov u Tišnova – Křižanov, kde dochází ke změnám u výluk pro aktivaci provizorního zabezpečovacího zařízení. Výluky plánované na této stavbě v roce 2024 jsou zatím beze změn a předpokládaný zastavený provoz avizovaný od 01.03.2024 v současné době platí. K dalším změnám bude docházet také na stavbě Beroun – Karlštejn. Z důvodu nesouhlasu Krajské hygienické stanice s konáním nočních výluk na této stavbě, dojde k přesunu cca 200 nočních výluk do denní doby. Vzhledem k této úpravě HMG stavby musí dojít i k úpravě JŘ od 08.01.2024. Samotná forma úpravy (změna, VNJŘ) je předmětem jednání.

- Upřesnil informace k rozeslané dopravní studii zpracované na VR 501 pro průvoz vlaků v měsíci lednu 2024 při pracích na ZZ na stavbě Pardubice hlavní nádraží. Na poradě konané dne 25.09.2023 v Praze bylo nepřesně uvedeno, že stěžejní omezení bude trvat 2 dny (08.01.2024 a 09.01.2024). Stěžejní omezení bude ale ve skutečnosti trvat delší dobu, a to v období od 06.01.2024 – do 14.01.2024. Toto omezení je požadováno pro aktivaci zabezpečovacího zařízení v dopravně Pardubice hlavní nádraží na přeloučském zhlaví s nutným opatřením v dálkové osobní dopravě i nákladní dopravě. Regionální osobní doprava bude vedena prostředky NAD. Další omezení jsou plánována při aktivaci zabezpečovacího zařízení na kostěnickém zhlaví na přelomu měsíců ledna a února 2024.
- V závěru porady představil prezentaci společnosti DB NETZE obsahující změny oznámené Správě železnic, státní organizaci na poradě konané dne 05.09.2023 v Bad Schandau. K 01.11.2023 dojde na DB NETZE k aktivaci pracoviště dispečera koridorů FRC 7 a RFC 8. Pracoviště bude zřízeno v Lipsku. Telefonický kontakt zůstane stejný, ale dojde ke změně e-mailové adresy. Dané pracoviště bude sloužit ke sběru informací zejména o požadované manipulaci v příhraničních stanicích. Kompletní prezentace společnosti DB NETZE je přílohou č. 4 tohoto zápisu a bude umístěna i na Portále provozování dráhy v sekci FRC koridory.

Průběh porady řídil schvalovatel výluk č. 5 Ing. Stanislav Novák, který během jednání:

- Představil změny u říjnových výluk požadovaných v obvodech schvalovatelů č. 1, 2. Tyto změny jsou znázorněny v následující tabulce.

Změnová tabulka – říjen 2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny
doplněno:						
301	23400 N	Havířov SK 1, 3. + TV, zhl. od námezničky výh. č. 12 po náv. Se9	08.,09.	08:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, napájecí převěs.	NVÚ, ND , náhrada za akci ROV 23400 etapa K
305	23478 A	Hranice na Moravě – Polom 1. TK+TV	05./06., 06./07.	23:40-03:40	Oprava osvětlení na zastávce Bělotín.	zrušení ROV 23405 A (CPS)
305	23478 B	Polom – Hranice na Moravě 2. TK+TV	07./08., 08./09.	23:40-03:40	Oprava osvětlení na zastávce Bělotín.	zrušení ROV 23405 A (CPS)
309	25029 A	Olomouc – Štěpánov: ETCS	18.09.-N-09.12.	19:30-N-24.00	Odstranění havarijního stavu – výpadek sítě GSM-R.	Dodatečný požadavek SSZT Olomouc na odstranění havarijního stavu ETCS – návaznost ROV na nepředpokládanou výluk.
dílčí změny:						
301	23387 B	Bystřice SK 2 bez TV, sudá jen TV, záhl. zhl. ze směru Návší od náv. 2L po nám. výh. č. 6, Návší – Bystřice 2. TK+TV	04.	07:40-18:00	Údržba TV, oprava GPK v km 303,050-303,150.	NVÚ , rozšíření časové náročnosti akce pro potřebu CPS-oprava GPK (pův. 7:40-13:00).

302	25022 B	Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník, zab. zař.: vypnutí TZZ. Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku, zab. zař.: vypnutí kolejového úseku T1. Hnojník, sděl. zař. drážní pevná linka. Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník, sděl. zař. traťový telefon. Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku, sděl. zař. traťový telefon. Hnojník, sděl. zař. připojení elektronického dopravního deníku na intranet. Hnojník, sděl. zař. připojení PC (ISOR) na intranet.	17.	07:00-14:00	V ŽST Hnojník přepojení traťového kabelu ve správě ČD-Telematika na nové kabely položené v místech výkopu pro PZS km 127,066 a 125,250.	úprava stavebních postupů, úprava rozsahu a termínu konání (původní termín 05.10.2023) V souběhu s ROV 23347 etapa J a ROV 25022 etapa A
305	23351 K	Ostrava pravé n. SK 244, 246 bez TV, SK 240–250 jen TV	27.10.-N-2.11.	07:00-N-7:00	Oprava SK 246.	NVÚ , změna st. postupů (pův. 05.10.-N-11.10.) předchází ROV 23351 L
309	23332 C	Moravičany: sudá + TV, Červenka – Moravičany: 2. + TV, Moravičany – Mohelnice: 2. + TV	01.	08:10-14:40	SEE OLC – Betonáž základů TV a údržba TV, ST OLC – Výměna kolejnic v TK.	VNJŘ ; na žádost ST OLC navýšení času pro odstranění závad, pův. do 12:10 hod.
zrušeno:						
301	25026 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. ETCS	30.09.-N-09.12.	08:00-N-24:00	Vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR.	Zamítnuto na požadavek MI ŽSR
301	23400 K	Haviřov SK 2. 6 + TV SK 8, 10 jen TV	08., 09.	08:00-16:00	Optimalizace ŽST Haviřov – betonáž základů TV, napájecí převěs.	
304	23463 A	Holešov – Třebětice TK bez TV Třebětice celá bez TV Třebětice – Hulín TK bez TV	16.,17.,18.,19.	07:30-14:00	Výstavba nadjezdu D49 v km 5,058, pokládka nosníků, úprava podskružení, bednění a armování říms, oprava TK, úprava průjezdného průřezu.	ZP+ND , na žádost zhotovitele, výstavba dálnice D49
304	23463 B	Holešov – Třebětice TK bez TV Třebětice celá bez TV Třebětice – Hulín TK bez TV	13./14.,14./15.,20./21.,21./22.	23:30-04:05	Výstavba nadjezdu D49 v km 5,058, pokládka nosníků, úprava podskružení, bednění a armování říms.	ZP , na žádost zhotovitele, výstavba dálnice D49
305	23351 L	Ostrava pravé n. SK 246, 248 bez TV, SK 240–250 jen TV, zhl. od námezniční výh. č. 313 po námezniční výh. č. 303	11.-N-24.	07:00-N-20:00	Oprava SK 246.	NVÚ , změna stavebních postupů (přesun akce na termín 02.11.-N-15.11.)
305	23405 A	Polom celá+TV, Hranice na Moravě – Polom 1.+2. TK+TV	03./04.,04./05.,05./06.,06./07.,07./08.,08./09.,09./10.,10./11.,11./12.,12./13.	23:40-03:40	CPS – pokládka nosníků na nový sil. Nadjezd.	ZP, ND , změna technologie postupu prací

308	23392 A	Vsetín SK 1 bez TV, její část od zarážedla v km 37,914 po nám. výh. č. 11 Vsetín, lichá jen TV, 1a + TV, Vsetín, záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka od nám. výh. č. 11 po náv. 1L	08./09.	23:25-02:45	Rekonstrukce ŽST Vsetín, sypaní kameniva do SK č. 2a, 2.	ZP+NVÚ. Na žádost SSV a zhotovitele – práce provedeny v předstihu souběh s ROV 23272 A.
311	23468 A	Bludov – Šumperk TK jen TV	02./03. 03./04.	23:30-4:15	Dokončovací práce na silničním mostě v ochranné zóně TV úseku Bludov – Šumperk (km 46,050 – 46,100).	LNT. Na žádost CPS – nezrušené neutrální pole (neuskutečněné výluky dle ROV 23274 přesunuté do prosince znemožňují konání této výluky).

Zástupce dopravce České dráhy, a. s. Ing. Ondřej Štěpán během jednání:

- Vznesl dotaz ke zrušeným říjnovým výlukám požadovaným Ředitelstvím silnic a dálnic na VR 305 dle ROV 23405 etapy A, zda skutečně ŘSD nebude již požadovat žádné další výluky zastavující provoz na VR 305 v dopravně Polom a úseku Hranice na Moravě – Polom.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – zástupci OŘ Ostrava tento dotaz prověří. V současné době ale Správa železnic, státní organizace nemá žádné informace, že by měly být nějaké další výluky ze strany ŘSD pro tuto akci požadovány. Pokud budou nárokovány, budou konány v zákrytu se zastavenými provozy stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše.

- Informoval o skutečnosti, že v nejbližší době budou zahajovány tendry na zajištění NAD při nepřetržitých zastavených provozech v rámci staveb na VR 324 Vlkov u Tišnova – Křižanov a na VR 322 Elektrizace Zastávky u Brna 2. etapa, které se budou konat v roce 2024. V této souvislosti apeloval na zástupce Správy železnic, státní organizace, aby v případě komplikací či změnách na daných stavbách byl o nich dopravce České dráhy, a. s. neprodleně informován.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – připomínku dopravce bereme na vědomí a v případě změn bude dopravce bez prodlení informován.

- Požádal o prověření možnosti úprav (posunu) časů u denních prosincových výluk dle ROV 25027 etap E a F stavby Lipník nad Bečvou – Drahotuše tak, aby tyto etapy končily co možná nejdříve.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – požadavek dopravce bereme na vědomí a bude prověřen.

- Vznesl dotaz na konstrukci VNJŘ pro denní prosincovou výluky na VR 704 dle ROV 63268 etapy C v dopravně Votice.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – potřeba zpracování VNJŘ byla prověřena a VNJŘ vzhledem k minimálnímu vlivu na provoz nebude pro tuto výluky zpracován.

Zástupce sdružení ŽESNAD.CZ, Ing. Jaroslav Tyle během jednání:

- Vyjádřil nesouhlasné stanovisko sdružení s konáním souběhu výluk dle ROV 23017 etap B a C generujících zastavený provoz v úseku Lipník nad Bečvou – Drahotuše ve třech nocích po sobě. Nesouhlas sdružení zdůvodňuje hrozícími problémy ve výrobě a požaduje mezi nočními zastavenými provozy ponechat časové rozestupy.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – toto stanovisko sdružení bylo již prověřeno v rámci připomínek z minulé celostátní měsíční výlukové porady. Ze strany zhotovitele došlo ke snížení počtu zastavených provozů, zbylé zastavené provozy je však nutné ponechat v rozsahu a posloupnosti dle plánů výluk z důvodu technologických postupů a pro zprovoznění provizorní Odbočky Jezernice „A“. V rámci porady byl vznesen dotaz ze strany Správy železnic, státní organizace směrem k dopravcům na jejich stanoviska k dané problematice. Dopravci METRANS Rail, s. r. o. a ČD Cargo, a. s. považují dané omezení za značné, ale budou ho akceptovat. Dopravce PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s. preferuje variantu sdružení ŽESNAD.CZ.

Dopravce CER Slovakia, a. s. preferuje rovněž variantu sdružení, ale s omezením se vypořádá. Zástupce osobní dopravy dopravce České dráhy, a. s. preferuje realizovat zastavené provozy za sebou tak, jak jsou naplánovány nyní.

Zástupce dopravce ČD Cargo, a. s., p. Jiří Buzovský během jednání:

- Požádal, aby změny výluk pro rekonstrukci Branického mostu v úseku Praha-Krč – Praha-Radotín odbor O16 ještě zapracoval do GVD 2024.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný požadavek dopravce bereme na vědomí a bude předán na odbor O16. Za Správu železnic, státní organizaci, ale nelze garantovat, že danému požadavku bude možno vzhledem ke všem okolnostem vyhovět.

2. Předhlášení plánovaných výlukových akcí v režimu 6+

Během zářijové celostátní měsíční výlukové porady nebyly v režimu 6+ předhlášeny žádné výluky.

3. Informace Stavebních správ o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb

Zástupce SSV Ing. Josef Valach informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)**“ – od 10/2023 bude zahájena etapa 0 pro přípravné práce – přeložky kabelizace ZZ, betonáže základů TV, odvodnění, práce na podchodu.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Ostrava Kunčice (mimo) – Ostrava-Svinov/Polanka**“ – projektant předložil žádost o výluky pro geotechnický průzkum na srpen 2023. Z důvodu konání jiných údržbových prací OŘ Ostrava v kolizních ramenech jsou výluky poskytnuty v průběhu listopadu.

Stavba „**Lipník n. B. – Drahotuše, BC**“ – zahájení realizace v 09/2023.

- září 2023 – betonáže základů trakčních stožárů
- říjen 2023 – pažení v ose os, úpravy TV
- listopad 2023 – práce na TV, pažení v ose os a zahájení úprav ZZ
- prosinec 2023 – úpravy ZZ a aktivace provizorního ZZ v celém mezistaničním úseku, vložení výhybek Odb. Jezernice A

Do 22.12.2023 je předpoklad realizace aktivace provizorního ZZ v celém mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník, včetně aktivace provizorní Odb. Jezernice A (včetně výhybek). Po jednání Odborné komise pro aktivaci ZZ je stanoven termín 25.11. – 05.12.2023. V mezistaničním úseku Drahotuše – Lipník n. B. bude trvale omezena maximální traťová rychlost na 100 km/h.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm**“ – v termínu 04. – 06.10.2023, v zákrytu s pracemi OŘ Ostrava, ST, budou provedeny dokončovací práce (3. podbití, stezky atd).

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Vsetín**“ – bylo projednáno sloučení SP4 a SP5 (rekonstrukce zhlaví a záhlaví směr Jablůnka), práce probíhají, od 01.08.2023 výluka záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka v ŽST Vsetín a SKS ŽST Vsetín, předpoklad trvání do druhé poloviny 12/2023. V roce 2024 proběhne SP6 a SP7 (dokončovací práce na zhlaví směr Jablůnka a Valašská Polanka).

Stavba „**Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc**“ – v listopadu výluky pro betonáže základů trakčních stožárů v úseku Grygov – Olomouc hl. n. TK 1+TV 3x9hodin, TK 2+TV 3x9hodin. Další požadavky výluk koordinovány se stavbou „LI-DR“.

Stavba „**Dokončení 1. železničního koridoru v traťovém úseku Lanžhot – Kúty**“ – stavba musí probíhat v koordinaci se stavbou ŽSR „**Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR**“ – na České straně byl v termínu 03. – 06.03.2023 realizován „S“ propoj. Ukončení rekonstrukce mostu v TK 2 s překlopením do TK 1 je plánováno na 18.09.2023 (podklad ŽSR).

Dne 22.03.2023 proběhla porada stavby na Slovenské straně, kde bylo konstatováno, že chybí jedno stavební povolení, předpoklad vydání v srpnu 2023. Bylo sděleno, že termín překlopení 18.09.2023 je velmi nereálný. Zpoždění je odhadováno minimálně na 3 měsíce.

Řeší se problematika TZZ a PZZ.

Dne 09.05.2023 proběhlo jednání i za účasti Slovenské strany s těmito předpoklady:

- 13.10. – 18.10.2023 ZP (20:30 – 16:00 hod.) - zrušení „S“ na naší a zrušení „S“ na slovenské straně, zavedení provozu v koleji č. 2 (včetně nového mostu) – v činnosti zůstane původní TZZ a PZS (zachováno napájení 6 kV)
- na jaře 2024 aktivace nového elektronického TZZ

Dne 02.06.2023 zaslala Slovenská strana nové termíny zprovoznění mostu ve 2.TK.

1. termín ZP 13. – 25.10.2023

2. termín ZP 26.01. – 01.02.2024

Dne 20.6.2023 proběhlo jednání, na kterém Slovenská strana potvrdila nový termín ZP **13. – 25.10.2023** pro zprovoznění mostu ve 2.TK.

Stavba „**Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 2. etapa**“ – v roce 2023 přednostně výstavba na „zelené louce“. Pro zemní práce a budování podchodu v ŽST Zastávka u Brna vyloučena SK 4 od 11.04.2023 a vyloučeny SK 5, 7, 9, 9a od 02.10.2023, ZP proběhne v termínu 30.04.-14.12.2024.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole**“ – vydáno Rozhodnutí o výběru dodavatele (běží zákonná lhůta), dle dalšího vývoje může dojít k žádání o výluky pro přípravné práce na 1/2024.

Stavby „**Rekonstrukce ŽST Vlkov u Tišnova**“ a „**Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)**“ – probíhají stavební řízení a soutěže na realizaci, aktuální předpokládané termíny „otevírání obálek“ 10.10. a 11.10.2023 (závislé na dotazech uchazečů). S ohledem na aktuální vývoj soutěží na realizaci staveb budou výluky pro aktivaci MPZZ Vlkov u Tišnova přesunuty z 11/2023 na 12/2023.

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled**“ – probíhá stavební řízení, probíhá soutěž na realizaci stavby, aktuální předpokládaný termín „otevírání obálek“ 16.10.2023 (závislý na dotazech uchazečů), výluky pro přípravné práce nejdříve od 01/2024 - bude upřesňováno.

Stavba „**Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC**“ – v 10/2023 napěťové zkoušky TV a pantografická zkouška.

Stavba „**Modernizace železničního uzlu Pardubice**“ – probíhá modernizace SK 2, 4, 6 a 8 vč. nástupiště č. 3 do 10/2023, následně od 09.10.2023 do 12/2023 výluka celé SKS v souběhu se ZP Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem stavby zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. Od 11/2023 postupná aktivace definitivních ZZ, práce se stěžejním vlivem na železniční provoz v 01 a 02/2024.

Stavba „**Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum**“ – probíhá realizace.

Stavba „**Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová**“ – od 9.10.2023 výluky pro aktivaci def. ZZ a nepřetržitý ZP Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. pro modernizaci zhlaví a záhlaví směr Pardubice hl. n. a Medlešice s předpokladem trvání do 12/2023. V rámci aktivace def. ZZ a prací na TV nepřetržitý ZP také v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová – pro nákladní dopravu v termínu 20.-23.10.2023, pro osobní dopravu v termínu 20.-25.10.2023.

Zástupce SSZ oblast Praha Ing. Tomáš Moravka informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Praha:

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa**“ – pokračuje nepřetržitými výlukami jednotlivých staničních kolejí pro jejich postupnou demontáž, které budou v polovině října zapracovány do změny ZDD. V polovině října dojde rovněž k napojení a aktivaci provizorního úvraťového propojení mezi tratí do Prahy-Žvahova a ŽST Praha-Smíchov osobní nádraží.

Stavba „**Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**“ – pokračuje v měsíci říjnu a listopadu krátkodobými denními a nočními výlukami traťové koleje Praha-Krč – Praha-Vršovice a Praha-Krč – Praha-Braník pro přípravné práce. V polovině ledna roku 2024 bude zahájena nepřetržitá výluka traťové koleje odbočka Tunel – Praha-Krč pro rekonstrukci mostu, která poběží do začátku července roku 2024, a nepřetržitá výluka traťové koleje Praha-Krč – Praha-Zahradní město pro rekonstrukci koleje a zahájení výstavby odbočky Spořilov a nového nástupiště na zastávce Praha-Kačerov, která poběží do poloviny května roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“ – pokračuje bez výluk, a bude ukončená na jaře roku 2024 krátkodobými výlukami pro dokončovací práce.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Čelákovice – Mochov mimo vlečku ČEPS, poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Mstětice včetně přilehlých traťových úseků pro realizaci překládky VN a NN. V měsíci lednu proběhnou denní výluky v ŽST Mstětice pro stavbu TZ.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 1. traťové koleje v úseku Praha-Horní Počernice – výh. Skály pro rekonstrukci traťového úseku a dokončení demontáže odbočky Černý Most, která poběží do poloviny prosince, a nepřetržitá výluka liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Horní Počernice včetně skalského záhlaví a zhlaví pro rekonstrukci liché kolejové skupiny a zhlaví, která poběží do poloviny prosince. Poslední 2 víkendy v měsíci listopadu proběhne výluka celé ŽST Praha-Horní Počernice včetně navazujících traťových úseků pro aktivaci definitivního ZZ, tažení definitivní trakce a další práce potřebné k zavedení zkušebního provozu. V průběhu ledna proběhnou krátkodobé výluky pro dokončovací práce.

Stavba „**Modernizace traťového úseku Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, která poběží do konce května roku 2025.

Stavba „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Lovosice**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou staničních kolejí č. 1, 3, 7, 9 a 11 v ŽST pro rekonstrukci IV. a III. nástupiště včetně přilehlých kolejí a související části podchodu, která poběží jako překročená do konce října. Na ní bude navazovat nepřetržitá výluka sudé části kolejiště pro rekonstrukci II. a I. nástupiště, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Rekonstrukce trati včetně protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou 2. traťové koleje v úseku Litoměřice dolní nádraží – Velké Žernoseky pro rekonstrukci traťové koleje a stavbu PHS, která poběží do poloviny prosince.

Stavba „**Optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb**“ – bude ukončená v měsíci říjnu týdenní nepřetržitou výlukou traťové koleje Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb pro dokončovací práce.

Stavba „**Rekonstrukce ŽST Bohosudov**“ – pokračuje výlukou 13. a 13a staniční koleje v ŽST Bohosudov, nepřetržitou výlukou liché kolejové skupiny v ŽST Bohosudov a 1. traťové koleje v úseku Chabařovice – Bohosudov pro rekonstrukci chabařovického záhlaví a zhlaví, která poběží do poloviny října. V polovině října bude zahájena nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro rekonstrukci Teplického záhlaví v ŽST Bohosudov, která poběží do konce října.

V měsíci listopadu proběhne 10denní nepřetržitá výluka 1. traťové koleje v úseku Teplice v Čechách – Bohosudov pro dokončovací práce, na ní bude navazovat týdenní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje v úseku Bohosudov – Teplice v Čechách pro dokončovací práce a komplexní opravu 4 přejezdů na této trati.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most**“ – bude zahájena v listopadu bez výluk, výluky budou zahájeny na začátku května roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostů v km 46,057 a km 46,015 trati Ledečko – Čerčany**“ – pokračuje bez výluk, druhá část stavby bude realizována v nepřetržité výluce traťové koleje v úseku Sázava – Samechov, která bude zahájena v dubnu roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ**“ – bude realizována nepřetržitou 6měsíční výlukou 1. traťové koleje v úseku Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, která bude zahájena v únoru roku 2024.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati Žatec – České Zlatníky (Obrnice)**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Žatec – Lišany u Žatce, která poběží do poloviny října.

Stavba „**Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati Řetenice – Úpořiny**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží do konce října.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P2096 trati Řetenice – Úpořiny**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Řetenice – Úpořiny, která poběží do konce října.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 71,250 – 71,280 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n., která poběží do poloviny listopadu.

Stavba „**Rekonstrukce náspu v km 72,300 – 72,350 v úseku Česká Lípa – Blíževedly**“ – pokračuje nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Blíževedly – Česká Lípa hl. n., která poběží do poloviny listopadu.

Stavba „**Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa**“ – bude realizována 8denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Litoměřice horní nádraží – Žalhostice, která poběží v září roku 2024;

Stavba „**Zvýšení stability skálních masivů na tratích Chotětov – Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město**“ – bude realizována 10denní nepřetržitou výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav hlavní nádraží – Mladá Boleslav město, která poběží na přelomu července a srpna roku 2024, a 2,5měsíční výlukou traťové koleje v úseku Mladá Boleslav – Chotětov, která poběží na podzim roku 2025.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby „**ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou**“, „**Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov**“, „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ a „**Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín**“.

Zástupce SSZ oblast Plzeň Bc. Tomáš Holar informoval o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSZ Plzeň:

Stavba „**Rekonstrukce traťového úseku Most – Kyjice – geotechnický průzkum**“ - výluky v listopadu a prosinci beze změn, zhotovitel je připraven na realizaci, probíhá příprava ROV.

Stavba „**ETCS Plzeň (mimo) – Cheb**“ - do listopadu jsou doplněny zbývající výluky a práce pro dokončení ETCS v ŽST Cheb (po dodání potřebného materiálu z výhybkárny) dle ROV 73273 et. D (11.11.), 73273 et. E (12.11.), 73382 et. C (20., 21. a 22.11.), 73229 et. J2 (23.11.) a 73416 et. A (17.-N- 18.11.) a 73416 et. B (18.-N-19.11.). Do ROV 73416 et. B byla doplněna výluka výhybky č. 56 (na požadavek zhotovitele).

Stavba „**Porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 v ŽST Karlovy Vary**“ - ROV 73007 et. A pokračuje do 31.5.2024, k aktuálnímu datu beze změn.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Aš**“- do 30.11.2023 pokračuje nepřetržitá výluka nástupiště u 1. SK v ŽST Aš a to v části mezi začátkem nástupiště (km 27,479) a úrovní návěstidla Sc1a (km 27,614). Výluka bude zahájena 01.10.2023.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Chodov**“- aktuálně bez požadavku na výluky.

Stavba „**Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Františkovy Lázně**“- předpoklad otevírání obálek 9/2023, další informace budou podány podle vývoje VŘ a výběru zhotovitele. Předpoklad prvních výluk 2/2024.

Stavba **Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň hl. n.**“- v listopadu a v prosinci beze změn. V lednu se bude konat 7 výluk pro odvoz vybourané sutě z budovy a pro návoz mechanizace potřebné pro rekonstrukci budovy v čase 01:25-03:55 (ROV 93008 et. A).

Stavba „**Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy – Koterov**“- v termínu od 20. do 23.11.2023 bude probíhat montáž protidotekových zábran na silničním nadjezdu v ulici Lobežská. Vždy se bude jednat o denní výluku (07:25-13:25) jedné ze dvou traťových kolejí (včetně výluky trakčního vedení) – 2x 1. TK a 2x 2. TK. V provozované sousední koleji bude zavedena pomalá jízda 50 km/h o délce 100 metrů v prostoru pod nadjezdem (ROV 93170 et. A, B).

Stavba „**Rekonstrukce neutrálních úseků TT Planá u ML a TT Mýto**“- realizace úpravy NP TT Planá u ML bude přesunuta do roku 2024 do souběhu se ZP určeným pro sanaci svahů v úseku Pňovany – Planá. V rámci této stavby bude potřeba doplnit následně výluky pro betonáž základů trakčního vedení. OŘ nesouhlasí s prováděním betonáže mimo kolej z důvodu možného narušení svahu (náspu). U stavby TT Mýto je požadována úprava termínu nepřetržitých výluk dle ROV 93115 et. D2, E2 do nových termínů 13.-N-14.11. (D2) a 15.-N-16.11. (E2). Ostatní výluky jsou beze změn, včetně zachování posledních dvou nočních výluk stavby dle etap D3 a E3. Zhotovitel je vybrán, je podepsána SoD a je předáno staveniště.

Stavba „**Optimalizace trati Beroun (mimo) – Karlštejn (mimo)**“- Po posledním kole jednání s dopravci a objednavateli dopravy budou denní výluky stavby v listopadu a v prosinci 2023 upraveny následovně – v listopadu se budou konat denní výluky pro terénní úpravy v úseku 2. TK Karlštejn – Beroun v čase 08:30-18:30 hod. dle ROV 63263 et. A1 v termínu 05. – 17.11.2023. V prosinci se budou konat denní výluky pro terénní úpravy v úseku 1. TK Beroun – Karlštejn v čase 08:30 – 18:30 a to v termínu 02. – 09.12.2023. Těmito přesuny dojde k odstranění termínů po přelomu JŘ. Zároveň jsou představeny denní výluky pro měsíc leden 2024 (s pokračováním do dalších měsíců roku 2024). U těchto výluk v novém JŘ se bude postupovat podle dohod z jednání, které se uskutečnilo ve druhé polovině září v Praze a čeká se na termín změny JŘ a zároveň bude nutné předložit nový aktualizovaný HMG těchto výluk ze strany zhotovitele. Uvedené změny generují i úpravu výluky dle ROV 93166 et. A, která řeší geotechnický průzkum na trati **Plzeň – Klatovy** (úsek Dobřany – Klatovy) **pro připravovanou revitalizaci trati**. Původně plánovaná výluka v termínu 20.11. – 04.12.2023 bude zkrácena a nově ukončena 1.12.2023 (mění se pouze termín). Rozsah prací pro CPS (obchvat Klatov) zůstává beze změn (požadavek 27.11. – 01.12.2023).

Doplnění z porady: podle informace Ř O12 Ing. Rolníka lze do plánů výluk zařazovat výluky této stavby po přelomu JŘ 2023/2024 od 08.01.2024 dále. K tomuto termínu by mělo dojít k úpravě JŘ. Tato informace bude přenesena ke zhotoviteli a bude řešeno dále v rámci standardních následujících výlukových předporad a porad.

Stavba „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)**“- listopad a prosinec beze změn. V lednu pokračují nepřetržité výluky v ŽST Kladno a v úseku Kladno – Kladno-Dubí dle ROV 63007 A+B (do 31.07.).

4. Projednání výluk nad RPV – leden 2024

Lednové výluky projednané na zářijové celostátní měsíční výlukové poradě nad rámec „Plánu omezení provozování dráhy na rok 2024“ jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Schvalovatel 1

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
301	Z-25005 A	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – výhybky na bartovickém zhlaví	08.01.2024-12.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u přestavníků na bartovickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25005 B	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla na bartovickém zhlaví a záhlaví	13.01.2024-16.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na bartovickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25005 B1	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L10, L12, L14, L16, L18, L20, L22	13.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na bartovickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25005 B2	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla Se29, Se30, L1, L5, Se22, Se23, Se25, Se26	14.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na bartovickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25005 B3	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L2, L6, L8, L10, L12, L14, L16, L18, L20, L22, Se24	15.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na bartovickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25005 B4	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla Se31, MSe1	16.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na bartovickém zhlaví	Nad RPV.
301	Z-25005 C	Havířov, zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody. kolejové obvody na bartovickém zhlaví a záhlaví v dopravně Havířov	17.01.2024-19.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace kolejových obvodů na bartovickém zhlaví	Nad RPV.

301	Z-25005 D	Havířov, zab. zař.: PZS v km 0,499 (P10642)	18.01.2024-19.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace k přejezdu v km 0,499 (P10642)	Nad RPV.
301	Z-25005 E	Havířov – Ostrava-Bartovice, zab. zař.: TZZ v 1. a 2. Havířov – Ostrava-Bartovice, zab. zař.: PZS v km 20,940 (P8296); v km 23,154 (P8297); v km 23,504 (P8298)	20.01.2024-22.01.2024	08:00 - 16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace souhlasového kabelu	Nad RPV.
301	Z-25005 E1	Ostrava-Bartovice – Havířov, 1. bez TV	22.01.2024	07:30 - 11:00	Optimalizace ŽST Havířov – zkoušení kódování	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-25005 E2	Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. bez TV	22.01.2024	11:20 - 14:50	Optimalizace ŽST Havířov – zkoušení kódování	Nad RPV. VNJŘ.
301	Z-23042 B	Havířov, 6., 8., 10. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po nám. výh. č. 48. Havířov – Ostrava-Bartovice, 2. + TV	27.01.2024-28.01.2024	07:30 - 17:30	SSV – optimalizace ŽST Havířov – SP0 (montáž TV, převěšení, betonáže základů) ST – kácení stromů	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
301	Z-23042 D	Havířov, 3., 6., 8., 12.-22. jen TV, 1., 2., 10. + TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od náv. 2S po nám. výh. č. 48	31.01.2024-01.02.2024	22:30 - 04:30	optimalizace ŽST Havířov SP0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	Nad RPV. ZP+ND.
301	Z-23042 A	Havířov, 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52. Ostrava-Bartovice – Havířov, 1. + TV	23.01.2024-26.01.2024	07:00 - 17:30	SSV – optimalizace ŽST Havířov – SP0 (montáž TV, převěšení, betonáže základů) ST – kácení stromů	Nad RPV. NVÚ+ND+VNJŘ.
301	Z-23042 C	Havířov, 3., 6.-22. jen TV, 1., 2. + TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po nám. výh. č. 52, od náv. 2S po nám. výh. č. 48. Ostrava-Bartovice – Havířov, 1., 2. + TV	28.01.2024-31.01.2024	22:30 - 04:30	optimalizace ŽST Havířov SP0 (montáž a demontáž bran, převěšení TV)	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 2

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

Schvalovatel 3

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

Schvalovatel 4

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
501	Z-55005 C	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: TZZ ve 2. traťové koleji	29.01.2024-05.02.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. původně 02.-04.02 VK+VNJR+ND. Jízda po 2TK mezistaničně v přednostním směru. Odjezdy na PN. Rychlost 100 km/h. V souběhu s výlukou 55005 D.
501	Z-55004 A	Pardubice hlavní nádraží, zab. zař.: SSZ. přestavníky výhybek 43, 77 návěstidla Lc2a, L2, L4, Sc2, Sc4	03.01.2024-04.01.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ, přestavníky výh. 43, 77.	Nad RPV. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží. Z Pardubic do Přelouče, a naopak pouze z lichých kolejí.

501	Z-55004 B	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek 74, 79, 85, 90, 91, 94	05.01.2024-14.01.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ, přestavník výh. č. 74, 79, 85, 90, 91, 94.	Nad RPV. ND. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží. Jízdy na PN. Nelze z kolejí č. 4 a 2 a z lichých SK do Pardubice-Rosice nad Labem a opačně. Nelze přejíždět mezi sudou a lichou skupinou kolejí na přeloučském zhlaví. ND Přelouč – Pardubice
501	Z-55004 C	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek 80, návěstidla 2S, Se57, Se61, Se68 a Se72	05.01.2024-09.01.2024	08:00 - 19:00	Aktivace SZZ, přestavník výh. č. 80.	Nad RPV. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží. Nelze obsluhovat 2S. Na tabuli k zavěšování hlavních klíčů výhybka č. 80 uzamknuta do přímého směru odtlačným zámkem. V souběhu s výlukou 53004 B, D.
501	Z-55004 D	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží , zab. zař.: TZZ ve 2. traťové koleji	06.01.2024-09.01.2024	08:00 - 19:00	Aktivace SZZ, TZZ 2. TK Pce – Přelouč.	Změna od RPV. původně 06. - 07.01. VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 55004 C, B, E. Jízda po 2TK mezistaničně v přednostním směru. Odjezdy na PN. Rychlost 100 km/h.
501	Z-55004 E	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží , zab. zař.: PZS v km 310,118 (P4904); 311,315 (P4905) a 312,103 (P4906)	06.01.2024-13.01.2024	08:00 - 19:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55004 B, H a C, D (obě do 09.01.). PZZ uzavřeny pro silniční provoz.

501	Z-55004 H	Přelouč nákladní nádraží – Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji	08.01.2024-13.01.2024	08:00 - 19:00	Aktivace SZZ, TZZ 1. TK Přelouč – Pce.	Změna od RPV. původně 06. - 07.01. VK+VNJR+ND. Do 09.01. v souběhu s výlukou 55004 D. V 1. TK mezistaničně v přednostním směru. Vjezdy na PN. Rychlost 100 km/h.
501	Z-55004 M	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží , zab. zař.: TZZ kódování ve 2. traťové koleji	09.01.2024-14.01.2024	19:00 - 12:00	Aktivace SZZ, TZZ kódování v 2. TK.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55004 H (do 13.01.).
501	Z-55004 F	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavník výhybky 41, 61b 72 návěstidla Lc1a, Sc1, Sc3, L3, L1, 1S, Se60, Se67 a Se71	10.01.2024-13.01.2024	08:00 - 19:00	Aktivace SZZ, přestavník výh. č. 41, 61b, 72.	Nad RPV. VK+VNJR+ND. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží. Po dobu výluky z 1. TK z Přelouče pouze na kol. č. 1.
501	Z-55004 G	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavník výhybky 61a, 67, 75, 81	10.01.2024-26.01.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ, přestavníky výh č. 61a, 67, 75, 81.	Nad RPV. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží. Po dobu výluky z 1. TK z Přelouče pouze na koleje č. 1 a 3.
501	Z-55004 K	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek 56, 57, 59, 60, 65, 69, 84, 86, 88, 89, 92, výkolejka Vk9, návěstidla L5, L7, L13, L15, L17, L19a, L21, Se 48, Se49, Se54, Se55, Se58, Se59, Se64, OSE64 a Se65	12.01.2024-26.01.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ, přestavníky výh. č. 56, 57, 59, 60, 65, 69, 84, 86, 88, 89, 92, výkolejka Vk9.	Nad RPV. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží.
501	Z-55004 L	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SPE St.Sp1. PSt.5, PSt.6 a PSt.7, vazba mezi SZZ ESA a StSp1	12.01.2024-15.03.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ, SPE St.SP1.	Nad RPV. PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Pardubice hlavní nádraží.

501	Z-55004 N	Přelouč nákladní nádraží – Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: TZZ kódování v 1. traťové koleji	13.01.2024-14.01.2024	19:00 - 17:00	Aktivace SZZ, kódování v 1. TK.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55004 M.
501	Z-55004 I	Pardubice hlavní nádraží – Přelouč nákladní nádraží , 2. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Pardubice hl. n. – ŽST Přelouč	14.01.2024	08:00 - 12:00	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. původně 08. - 10.01. VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 55004 M, N.
501	Z-55004 J	Přelouč nákladní nádraží – Pardubice hlavní nádraží , 1. bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč – ŽST Pardubice hl. n.	14.01.2024	13:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. původně 08. - 10.01. VK+VNJR+ND. V souběhu s výlukou 55004 N do 17:00.
501	Z-55005 A	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: PZS v km 297,908 (P4902)	29.01.2024-05.02.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV. PZS v km 297,908 (P4902) uzavřeno pro silniční dopravu. V souběhu s výlukou 55005 B, C, D.
501	Z-55005 B	Kostěnice – Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: PZS v km 302,038 (P4903)	29.01.2024-05.02.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Nad RPV. PZS v km 302,038 (P4903) uzavřeno pro silniční dopravu. V souběhu s výlukou 55005 A, C, D.
501	Z-55005 D	Pardubice hlavní nádraží – Kostěnice , zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji	29.01.2024-05.02.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. původně 02.-04.02 VK+VNJR+ND. Jízda po 1. TK mezistaničně v přednostním směru. Odjezdy na PN. Rychlost 100 km/h. V souběhu s výlukou 55005 C.

501	Z-55005 E	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SSZ, přestavníky výhybek č. 8, 10, 12, 16	29.01.2024-05.02.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. původně 30.01. - 01.02. Jízdy na PN. Nelze přejíždět mezi sudou a lichou skupinou kolejí na kostěnickém zhlaví. V souběhu s výlukou 55005 C, D, G a F (do 01.02.).
501	Z-55005 F	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ, přestavníky výhybek č. 3, 6, 17, 23, 28, návěstidla Se3, Se6, Se12, Se15, S2a, S6, S10b, Se23, 2L	29.01.2024-01.02.2024	08:00 - 17:00	Aktivace SZZ.	Změna od RPV. původně 30.01. - 01.02. Od/do Kostěnic pouze koleje 1, 2, 3, 4. Jízda na PN. V souběhu s výlukou 55005 C, D, E, G.
501	Z-55005 G	Pardubice hlavní nádraží , zab. zař.: SZZ, přestavník výhybky č. 1, návěstidla Se5, Sc10a, Sc12a, Se17, Se18, Lc10a, Lc12a	29.01.2024-15.03.2024	08:00 - 17:00	Přepínání EMP výhybky č. 1 a návěstidel Se5, Sc10a, Sc12a, Se17, Se18, Lc10a, Lc12a na ovládání z JOP ESA.	Nad RPV. V souběhu s výlukou 55005 C, D, E (všechny do 05.02), F (do 01.02.).

508	Z-53013 A	Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná , traťová bez TV, Bílá Třemešná , celá bez TV, Bílá Třemešná – Mostek , traťová bez TV, Mostek , celá bez TV, Mostek – Horka u Staré Paky , traťová bez TV, Horka u Staré Paky , celá bez TV, Horka u Staré Paky – Stará Paka , traťová bez TV, Dvůr Králové nad Labem , záhl. směr Bílá Třemešná. Stará Paka , záhl. směr Horka u Staré Paky	22.01.2024-25.01.2024	07:30 - 15:25	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.
508	Z-53013 B	Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem , traťová bez TV, Jaroměř , záhl. směr Dvůr Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem , záhl. směr Jaroměř	29.01.2024-31.01.2024	06:45 - 15:15	Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva.	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 5

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
523	Z-63028 A	<p>Praha-Krč, záhl. a zhl. směr Odb Tunel od návěstidla RL po návěstidlo Se6 a po izolovaný styk v km 5,766 (před hroty výh. č. 5).</p> <p>Praha-Krč – Odb Tunel, traťová bez TV,</p> <p>Odb Tunel, celá bez TV, kolejově od návěstidla L po návěstidlo 3S, 4S</p> <p>Odb Tunel – Odb Závodiště, 3., 4. bez TV, od návěstidla 3S, 4S (odb Tunel) po návěstidlo 3L, 4L (Odb Závodiště)</p> <p>Praha-Krč – Odb Tunel, traťová jen TV, napětově od ÚO 414 v km 6,865 (P. Krč) po ÚO 404 km 10,159 (Odb Tunel)</p> <p>Odb Tunel, celá jen TV, napětově od ÚO 404 v km 10,159 po ÚO 414 v km 10,760</p> <p>Odb Tunel – Odb Závodiště, 3., 4. jen TV, od ÚO 414 v km 10,760 (Odb Tunel) po ÚO 403/404 v km 11,660 (odb Závodiště)</p>	10.01.2024-01.07.2024	07:30 - 17:30	zdvoukolejnění tratě + oprava mostu v km 9,680	Nad RPV. ZP.
523	Z-63028 B	<p>Praha-Krč – Praha-Zahradní Město, traťová + TV,</p> <p>Praha-Krč, záhl. a zhl. směr od náv. VS směr Praha-Zahradní Město po izolovaný styk v km 5,584 (mezi výh. č. 28 a č. 34)</p>	10.01.2024-22.05.2024	07:30 - 17:30	rekonstrukce, budování odb. Spořilov a zast. Kačeroz	Nad RPV. ZP.

Schvalovatel 6

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
521	Z-63010 B1	Beroun – Karlštejn , 1. + TV, Beroun , záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po náv. Se3. Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od náv. S po námezník výh. č. 14	08.01.2024-15.01.2024, 30.01.2024-31.01.2024	08:30 - 18:30	terénní úpravy	Nad RPV. VNJR+ND.
521	Z-63010 A1	Karlštejn – Beroun , 2. + TV, Karlštejn , záhl. a zhl. směr Beroun od úrovně náv. S u 1. TK po náv. Se2. Beroun , záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po izolovaný styk v km 37,700 (mezi výh. č. 1 a 6)	16.01.2024-29.01.2024	08:30 - 18:30	terénní úpravy, stavba TZ	Nad RPV. VNJR+ND.

Schvalovatel 7

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
510	Z-53012 A	Trutnov hlavní nádraží – Pilínkov , traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží , záhl. směr Pilínkov. Pilínkov , celá bez TV, Pilínkov – Hostinné , traťová bez TV	08.01.2024-11.01.2024, 15.01.2024-18.01.2024	07:25 - 15:20	kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva	Nad RPV. ZP+ND.

Schvalovatel 8

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

Schvalovatel 9

VR	ROV	úsek TK, ŽST SK	Datum	čas	účel	poznámka
-						

5. Projednání změn MP – listopad 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 302 – Došlo k úpravě časů zahájení denních výluk dle **ROV 23410 etap B** v dopravně **Paskov**. Výluky budou probíhat ve dnech 06.11.2023, 07.11.2023 v časech od 08:00 hod. – do 17:00 hod. a jsou požadovány pro opravné práce.

VR 309 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53189 etapa P** v dopravně **Rudoltice v Čechách** dne 15.11.2023 v čase od 07:20 hod. – do 13:20 hod. Výluka je požadována na podbíjení.

VR 309 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 53189 etapa R** v dopravně **Rudoltice v Čechách** dne 16.11.2023 v čase od 07:20 hod. – do 13:20 hod. Výluka je požadována na podbíjení.

VR 311 – Došlo k úpravě času začátku denní výluky dle **ROV 23430 etapy A** v úseku **Šternberk – Bohuňovice** a v dopravnách **Šternberk a Bohuňovice**. Výluka bude probíhat dne 08.11.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro kácení a výřez vegetace.

VR 311 – Došlo k úpravě času začátku denní výluky dle **ROV 23430 etapy B** v úseku **Bohuňovice – Olomouc hlavní nádraží** a v dopravnách **Bohuňovice a Olomouc hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat dne 07.11.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro kácení a výřez vegetace.

VR 318 – Došlo k formální úpravě z nočních na nepřetržité výluky dle **ROV 33243 etapy A1** v úseku **Velké Pavlovice – Zaječí**. Výluky budou probíhat v termínech 10.11.2023 (od 23:50 hod.) – 11.11.2023 (do 06:30 hod.) a 16.11.2023 (od 23:50 hod.) – 17.11.2023 (do 06:30 hod.) a jsou požadovány pro opravu nadjezdu D2.

VR 318 – Došlo k formální úpravě z nočních na nepřetržité výluky dle **ROV 33243 etapy A2** v úseku **Velké Pavlovice – Zaječí**. Výluky budou probíhat v termínech 11.11.2023 (od 23:50 hod.) – 12.11.2023 (do 08:30 hod.), 17.11.2023 (od 23:50 hod.) – 18.11.2023 (do 08:30 hod.), 18.11.2023 (od 23:50 hod.) – 19.11.2023 (do 08:30 hod.) a jsou požadovány pro opravu nadjezdu D2.

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 50018 etapa A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 13.11.2023 (od 09:00 hod.) – 02.12.2023 (do 18:00 hod.) a je požadována pro opravu kolejové váhy.

VR 502 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65023 etapa A** v dopravně **Nymburk seřadovací nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 14.11.2023 (od 08:00 hod.) – 01.12.2023 (do 18:00 hod.) a je požadována pro demontáž KB, montáž PHB, sanaci železničního svršku a přezkoušení.

VR 503 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73323 etapy A** v dopravně **Děčín východ**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2023 (od 07:00 hod.) – 01.12.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro odstranění blátivých míst, výměnu pražců, strojní úpravu GPK.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73424 etapa A** v dopravně **Světec**. Výluka bude probíhat dne 24.11.2023 v čase od 07:15 hod. – do 15:30 hod. a je požadována pro navaření srdcovky.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73424 etapa B** v dopravně **Světec**. Výluka bude probíhat dne 25.11.2023 v čase od 07:15 hod. – do 15:30 hod. a je požadována pro navaření srdcovek.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73424 etapa C** v úseku **Ohníč – Světec** v dopravně **Světec**. Výluka bude probíhat dne 27.11.2023 v čase od 07:10 hod. – do 16:00 hod. a je požadována pro navaření srdcovky a údržbu odvodnění.

VR 504 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73423 etapa A** v dopravně **Chomutov**. Výluka bude probíhat dne 20.11.2023 v čase od 08:00 hod. – do 12:00 hod. a je požadována pro opravu výhybky.

VR 515 – Došlo ke změně denních výluk na nepřetržitou výluku dle **ROV 63233 etapy A** v úsecích **Kolín – Ratboř – Bečváry**. Výluka bude probíhat v termínu 20.11.2023 (od 08:00 hod.) – 24.11.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro doplnění ŠL, podbití a výřez vegetace.

VR 519 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63271 etapy A** v dopravně **Strančice** v termínech 20./21.11.2023, 21./22.11.2023 v časech od 23:10 hod. – do 05:10 hod. Výluky jsou požadovány pro čištění a údržbu nadchodu.

VR 519 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 63271 etapy B** v dopravně **Strančice** v termínech 22./23.11.2023, 23./24.11.2023 v časech od 23:10 hod. – do 05:10 hod. Výluky jsou požadovány pro čištění a údržbu nadchodu.

VR 521 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63263 etap A1** v úseku **Karlštejn – Beroun**. Výluky budou probíhat ve dnech 05.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023, 10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023 a 17.11.2023 v časech od 08:30 hod. – do 18:30 hod. a jsou požadovány pro terénní úpravy.

VR 527 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 73379 etapa F** v dopravně **Ústí nad Labem sever**. Výluka byla požadována dne 14.11.2023 v čase od 07:30 hod. – do 14:00 hod. pro navaření srdcovky. Práce byly provedeny v předstihu v rámci nepředpokládané výluky.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65021 etapa A** v dopravně **Zlonice**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2023 (od 08:00 hod.) – 08.12.2023 (do 15:00 hod.) a je požadována pro úpravu ZZ.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65021 etapa C** v dopravně **Zlonice**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2023 (od 08:00 hod.) – 01.12.2023 (do 15:00 hod.) a je požadována pro přemístění závorových pohonů.

VR 539 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 73422 etapa A** v úseku **Lovosice – Žalhostice** a v dopravně **Žalhostice** dne 20.11.2023 v čase od 08:00 hod. – do 16:00 hod. Výluka je požadována pro strojní úpravu GPK.

VR 708 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93160 etapa A** v úseku **Prachatice – Chroboly** a v dopravně **Prachatice lázně**. Výluka bude probíhat v termínu 07.11.2023 (od 08:00 hod.) – 06.12.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro celkovou výměnu kolejových roštů se strojním čištěním, zřízení BK, výměnu přejezdových konstrukcí a odstranění zavedených pomalých jízd.

VR 708 – Byly doplněny denní výluky dle **ROV 93160 etapy B** v úseku **Chroboly – Zbytiny** a v dopravnách Chroboly a Zbytiny ve dnech 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023 v časech od 09:25 hod. – do 14:40 hod. Výluky jsou požadovány pro údržbové práce a kácení stromů.

VR 710 – Byly doplněny noční výluky dle **ROV 93173 etapy A1** v úseku **Běšiny – Klatovy** v termínech 29./30.11.2023, 30.11./01.12.2023 v časech od 20:25 hod. – do 04:30 hod. Výluky jsou požadovány CPS pro snesení skružení silničního mostu.

VR 711 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 93166 etapy A** v úsecích **Dobřany – Chlumčany u Dobřan – Přestice – Švihov u Klatov – Klatovy** a v dopravnách Chlumčany u Dobřan, Přestice, Švihov u Klatov. Výluka bude probíhat v termínu 20.11.2023 (od 08:25 hod.) – 01.12.2023 (do 16:10 hod.) a je požadována pro úpravu TV a geotechnický průzkum.

6. Projednání změn SUP – prosinec 2023

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 501 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV A 50018 etapa A** v dopravně **Pardubice hlavní nádraží**. Výluka bude probíhat v termínu 13.11.2023 (od 09:00 hod.) – 02.12.2023 (do 18:00 hod.) a je požadována pro opravu kolejové váhy.

VR 503 – Došlo ke změně termínu konání nepřetržité výluky dle **ROV 73323 etapy A** v dopravně **Děčín východ**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2023 (od 07:00 hod.) – 01.12.2023 (do 17:00 hod.) a je požadována pro odstranění blátivých míst, výměnu pražců, strojní úpravu GPK.

VR 521 – Byla doplněna denní výluka dle **ROV 63180 etapa K7** v dopravně **Praha-Krč** dne 01.12.2023 v čase od 18:30 hod. – do 24:00 hod. Výluka je požadována pro skládku kolejnic.

VR 521 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 63263 etap B1** v úseku **Beroun – Karlštejn**. Výluky budou probíhat ve dnech 02.12.2023, 03.12.2023, 04.12.2023, 05.12.2023, 06.12.2023, 07.12.2023, 08.12.2023 a 09.12.2023 v časech od 08:30 hod. – do 18:30 hod. a jsou požadovány pro terénní úpravy.

VR 528 – Došlo k úpravě vymezení u přesunutých denních dle **ROV 63252 etap A1**. Výluky budou probíhat v úseku **Praha-Stodůlky – Praha-Waltrovka** ve dnech 04.12.2023, 05.12.2023, 06.12.2023, 07.12.2023, 08.12.2023 v časech od 08:30 hod. – do 17:30 hod. a jsou požadovány CPS pro údržbu silničního nadjezdu.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65021 etapa A** v dopravně **Zlonice**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2023 (od 08:00 hod.) – 08.12.2023 (do 15:00 hod.) a je požadována pro úpravu ZZ.

VR 529 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 65021 etapa C** v dopravně **Zlonice**. Výluka bude probíhat v termínu 27.11.2023 (od 08:00 hod.) – 01.12.2023 (do 15:00 hod.) a je požadována pro přemístění závorových pohonů.

VR 707 – Byla **zrušena** denní výluka dle **ROV 93161 etapa A** v úseku **Černý Kříž – Nové Údolí** a v dopravně **Nové Údolí**. Výluka byla požadována dne 06.12.2023 v čase od 08:15 hod. – do 13:20 hod. pro údržbové práce a kácení stromů.

VR 708 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93160 etapa A** v úseku **Prachatice – Chroboly** a v dopravně **Prachatice lázně**. Výluka bude probíhat v termínu 07.11.2023 (od 08:00 hod.) – 06.12.2023 (do 16:00 hod.) a je požadována pro celkovou výměnu kolejových roštů se strojním čištěním, zřízení BK, výměnu přejezdových konstrukcí a odstranění zavedených pomalých jízd.

VR 708 – Došlo ke změně termínů konání denních výluk dle **ROV 93160 etap C** v úseku **Zbýtiny – Volary**. Výluky budou probíhat ve dnech 04.12.2023, 05.12.2023 v časech od 09:20 hod. – do 14:35 hod. a jsou požadovány pro údržbové práce a kácení stromů.

VR 708 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 93160 etapy A** v úseku **Prachatice – Chroboly** a v dopravně **Prachatice lázně** ve dnech 04.12.2023, 05.12.2023 v časech od 07:35 hod. – do 14:30 hod. Výluky byly nahrazeny nepřetržitou výlukou.

VR 708 – Byly **zrušeny** denní výluky dle **ROV 93005 etapy A** v úseku **Chroboly – Zbýtiny** a v dopravnách **Chroboly** a Zbýtiny ve dnech 13.12.2023, 14.12.2023, 15.12.2023 v časech od 09:25 hod. – do 14:40 hod. Výluky byly přesunuty do měsíce listopadu 2023.

VR 710 – Byla doplněna noční výluka dle **ROV 93173 etapa A1** v úseku **Běšiny – Klatovy** v termínu 30.11./01.12.2023 v čase od 20:25 hod. – do 04:30 hod. Výluka je požadována CPS pro snesení skružení silničního mostu.

VR 710 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93173 etapa A** v úseku **Běšiny – Klatovy** v termínu 01.12.2023 (od 20:25 hod.) – 02.12.2023 (do 13:30 hod.). Výluka je požadována CPS pro snesení skružení silničního mostu.

VR 710 – Byla doplněna nepřetržitá výluka dle **ROV 93173 etapa A2** v úseku **Běšiny – Klatovy** v termínu 02.12.2023 (od 20:25 hod.) – 02.12.2023 (do 07:25 hod.). Výluka je požadována CPS pro snesení skružení silničního mostu.

VR 711 – Došlo ke zkrácení nepřetržité výluky dle **ROV 93166 etapy A** v úsecích **Dobřany – Chlumčany u Dobřan – Přestice – Švihov u Klatov – Klatovy** a v dopravních **Chlumčany u Dobřan, Přestice, Švihov u Klatov**. Výluka bude probíhat v termínu 20.11.2023 (od 08:25 hod.) – 01.12.2023 (do 16:10 hod.) a je požadována pro úpravu TV a geotechnický průzkum.

7. Projednání změn SP – leden 2024

Předmětem jednání bylo projednávání návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) na příslušné období.

Připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy na příslušné období vznesené před konáním porady:

Bez připomínek.

Změny a připomínky účastníků k návrhu plánu omezení provozování dráhy a příslušné období vznesené v průběhu porady:

VR 305 – Zástupce dopravce České dráhy, a. s. upozornil, že čas nočních výluk se zastaveným provozem v úseku **Lipník nad Bečvou – Drahotuše** dle **ROV 23049 etap A** nekoresponduje s časem, kdy v JŘ není přidělována kapacita.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – dodatečně po poradě byl prověřen časový rozsah zastavených provozů. JŘ GVD 2024 respektuje zastavené provozy v čase od 0:20 hod. – do 04:20 hod. ve dnech 02.01.2024 – 15.02.2024. Pro tento časový rámec jsou na konkrétní dny upraveny trasy vlaků osobní dopravy, např. odjezdy z Prahy nebo jiných stanic, vedení vlaků 456 a 457 odklonem trasou Hulín – Holešov – Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě a opačně. Od dopravce České dráhy, a. s. je požadavek ukončení před vlakem 442 (průjezd dopravnou Drahotuše ve 04:22 hod. a ranním rozjezdem osobní dopravy). Výluky dle ROV 23049 etapy A jsou v současné době noční zastavené provozy v čase od 23:30 hod. – do 03:30 hod. v termínu od 02./03.01.2024. Na předjednání staveb dne 03.10.2023 v Ostravě bude projednána úprava konání zastaveného provozu na čas od 0:20 hod. – do 4:20 hod. Dne 02.01.2024 (noc z 01./02.01.2024) se zastavený provoz konat nebude. Co se týká tří nočních zastavených provozů v měsíci prosinci 2023 – (17./18.12.2023, 18./19.12.2023 a 19./20.12.2023) ty se v GVD 2024 nezohledňují. Zde ještě není jasné, jestli bude platit ze strany dopravců opatření jiné nebo dopravci budou požadovat čas zastavených provozů jako v lednu 2024 a budou kopírovat opatření a časové polohy.

VR 324 – Vzhledem k výlukové činnosti ve stanici Pardubice hlavní nádraží – (přepínání ZZ) a předpokladu odklonové vozby na VR 324 a 502 v období od 06.01.2024 – do 13.01.2024 bude u výluk požadovaných ve dnech 06.01.2024 a 07.01.2024 na VR 324 potřeba prověřit VNJR u **ROV B 32A07020 a 32A07019** a u výluky **dle ROV 33017 etapy A** v úseku **Pohled – Havlíčkův Brod** dne 13.01.2024 požaduje dopravce České dráhy, a. s. prověřit přesun na jiný vhodný termín mimo termíny odklonové vozby.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – Daná problematika bude prověřena a řešena na následující regionální výlukové poradě.

VR 521 – Správa železnic, státní organizace aktualizovala informace k výlukám dle **ROV 63010 etapám A1, B1** v úseku **Beroun – Karlštejn** a informovala o předpokládané úpravě JŘ od 08.01.2024. Zástupce dopravce České dráhy, a. s. společně se zástupcem sdružení ŽESNAD.CZ vyjádřil k těmto výlukám v podobě v jaké jsou zadány nesouhlasné stanovisko a požaduje, aby výluky v tomto úseku byly z plánů vyjmuty, dokud nebude vyjasněno procesně zajištění a organizace provozu.

Vyjádření Správy železnic, státní organizace – daný stav bude prověřen a dle možností dojde k úpravě daných požadavků.

*Připomínky k projednávání příslušného návrhu plánu omezení provozování dráhy (nebo jeho změny) **mohou zúčastnění i nepřítomní účastníci porady uplatňovat do 3 pracovních dní ode dne doručení návrhu.** Pokud nebudou připomínky v této lhůtě vzneseny, má Správa železnic, státní organizace za to, že účastníci připomínky nemají a předložený návrh je tímto projednaný.*

8. Různé

Provozovatel dráhy Správa železnic, státní organizace informuje, že všechny výluky projednáváné na dnešní CMVP v rámci střednědobého plánování, u nichž je uplatněn požadavek na konstrukci VNJR, budou v případě realizace výluky s konstruovaným VNJR generovat proporcionální odejmutí, resp. omezení, dříve přidělené kapacity dráhy všem dopravcům, přímo dotčeným každou konkrétní výlukou.

9. Závěr

Projednané střednědobé plány v konečné schválené podobě budou zveřejněny na Portále provozování dráhy.

Následná společná celostátní měsíční výluková porada za účasti dopravců a objednavatelů osobní dopravy se uskuteční v říjnu 2023 v Praze. Podrobnosti budou upřesněny v připravované pozvánce.

Příloha č. 3 Změnové tabulky listopad a prosinec 2023

Změnové tabulky listopad 2023

Schvalovatel 1

měsíc: listopad 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyložený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23422 S	Havířov SK 6, 14, 22 + TV, SK 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 jen TV, zhl. ze sm. O.Bartovice od IS mezi výh. č. 47 a 44ab po náv. L10-L22	11./12., 12./13., 13./14.	22:30-4:30	optimalizace ŽST Havířov – montáž a demontáž napájecího převěsu	LNT, ND	SSV	HAV
301	25030 A	Havířov SSZ částečné – výhybky na albrechtickém zhlaví	15.-N-20.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u přestavníků na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 B	Havířov SSZ částečné – návěstidla na albrechtickém zhlaví a záhlaví	21.-N-24.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na albrechtickém zhlaví a záhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 B1	Havířov SSZ částečné – návěstidla 1L, 2L, Se1, Se2, Se5, Se6	21.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 B2	Havířov SSZ částečné – návěstidla S1, S2, S3, S5, Se11, Se12, Se13, Se14	22.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 B3	Havířov SSZ částečné – návěstidla S4, S6, S8, S10, PřSL, SL, Se3, Se8, Se9, Se10	23.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 B4	Havířov SSZ částečné – návěstidla S12, S14, S16, S18, S20, S22	24.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace u návěstidel na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 C	Havířov SSZ částečné – kolejové obvody SKa na albrechtickém zhlaví a záhlaví	25.11.-N-1.12.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kolejových obvodů na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 D	Havířov PZS v km 19,521 (P10641)	30.11.-N-1.12.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení souhlasového kabelu	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV

305	23351 L	Ostrava pravé n. SK 246, 248 bez TV, SK 240–250 jen TV, zhl. od námezňíku výh. č. 313 po námezňík výh. č. 303	2.-N-15.	7:00-N-20:00	oprava SK 248	změna stavebních postupů (přesun akce z termínu 11.10.-N-24.10.)	OVA	
305	23351 K	Ostrava pravé n. SK 244, 246 bez TV, SK 240–250 jen TV	27.10.-N-2.11.	7:00-N-7:00	oprava SK 246	NVÚ , změna stavebních postupů (pův. 5.10.-N-11.10.) předchází ROV 23351 etapa L	OVA	
305	25027 H	Lipník nad Bečvou celá bez TV	26.	0:00-1:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" a odb. Jezernice "B" - výměna SW	ZP+ND ; na žádost SSV změna rozsahu, účelu, termínu a času (pův. 1.12., v čase 0:00-3:00 h)	SSV	BC LiDr
316	33111 C	Bzenec přívoz výh. č. 20	16.	7:10-13:40	nutné navaření srdcovky	jednokolejný provoz Bzenec přívoz-Rohatec	BNO	
dílčí změny:								
301	23411 A	Havířov výh. č. 11	14.	7:30-15:30	navazování srdcovky výh. č. 11	přesun realizace z důvodu kolize stavby Havířov (pův. 15.11.2023)	OVA	
301	23422 M	Havířov SK 18, 20, 22 + TV	21., 22., 23., 24.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ , změna rozsahu s vazbou na změnu pracovních postupů SSZ	SSV	HAV
305	25027 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše TZZ 1. a 2. TK, Lipník nad Bečvou SZZ, ETCS, PZZ v km 199,554 (P6492), Drahotuše SZZ	25.11.-N-5.12.	8:45-N-15:00	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice "A" a Odb Jezernice "B" - doplnění návěstidel, odborná komise, zkoušky TZZ.	VNJR+ND ; na žádost SSV změna rozsahu, času, termínu a účelu výluky (pův. do 30.11., 14:00 h).	SSV	BC LiDr
305	25027 B	Drahotuše celá bez TV	27.	0:00-1:00	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice "A" a Odb Jezernice "B" - výměna SW	ZP+ND ; na žádost SSV změna rozsahu, účelu a času vyloučení (původně v čase 0:00-3:00 h)	SSV	BC LiDr
305	25027 C	Lipník nad Bečvou – Drahotuše ETCS	25.11.-N-9.12.	8:45-N-24:00	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice "A" a Odb Jezernice "B"	Na žádost SSV změna času (původně v čase 8:00-24:00)	SSV	BC LiDr

305	23419 A	Přerov přednádraží SK 220, 222, 238, 240 jen TV, SK 212, 214, 216, 218 + TV, vypnutí SZZ – kolejové úseky V205-209, V213-225, V276-290, Přerov SK 20 jen TV, částečně od ÚO 212 po ÚD 35, 36, 37, 38	1.-N-30.	7:00-N-17:00	Celková oprava staničních kolejí s výměnou pražců, kolejnic, LIS, svařováním a čištěním ŠL	NVÚ ; na žádost PO OLC navýšení rozsahu o SZZ – obsazené kol. obvody	OVA	
zrušeno:								
301	25026 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. ETCS	30.09.-N-09.12.2023	8:00-N-24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Zamítnuto na požadavek MI ŽSR	OVA	
301	23411 B	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína 1. TK+TV	27.	7:10-17:00	oprava GPK ASP	VNJŘ, ND , rušení z důvodu kolize stavby Havířov (předpoklad v říjnu využití v jiné výluce)	OVA	
301	23422 F	Havířov SK 2 bez TV, SK 2–10 jen TV	12., 13., 14.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, ND , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23411 D	Albrechtice u Českého Těšína - odb.Chotěbuz 1. TK+TV	28.	7:00-15:00	kácení stromů	VNJŘ, ND , kolize stavby Havířov	OVA	
301	23422 G	Havířov SK 6, 8, 10 bez TV, SK 2–10 jen TV	15.	7:30-15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, ND , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23422 H	Havířov: 8, 10, 12 bez TV, SK 2–16 jen TV	16.,17.	7:30-15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, ND , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23422 I	Havířov SK 2, 4, 6, 8, 10 + TV	18.	7:30-15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž zákl. TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, ND , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23422 J	Havířov SK 2, 4, 6, 8, 10 + TV, zhl. ze směru O. Bartovice od náv. L2, L6, L8 po IS mezi výh. č. 50-56	19.	7:30-15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, ND , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV

301	23422 K	Havířov SK 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22a bez TV, sudá jen TV, zhl. ze směru Albrechtice u Č. Těšína od náv. S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22 po námezník výh. č. 7	20.	7:30-15:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, ND , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23422 L	Havířov SK 12, 14 bez TV, SK 12, 14, 16 jen TV	21.-N-24.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14, úprava TV	NVÚ , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ a přesun akce na termín 2.12. až 5.12.2023	SSV	HAV
301	23422 N	Havířov SK 18, 20, 22 bez TV, zhl. směr O.Bartovice od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24. (nemožná obsl. vl. Metrans)	24.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23422 O	Havířov SK 18, 20, 22 + TV	25., 26., 27., 28.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23422 P	Havířov SK 16, 18 bez TV, SK 12, 14, 20, 22 jen TV	29.11.-N-1.12.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18, úprava TV	NVÚ , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ a přesun akce na termín 6.12. až 8.12.2023	SSV	HAV
305	25027 D	Lipník nad Bečvou – Drahotuše TZZ v 1. a 2. TK. částečně od Odb Jezernice "A" po ŽST Drahotuše, Drahotuše SZZ	30.11.-N-5.12.	14:00-N-16:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - doplnění návštěvidel, odborná komise, zkoušky TZZ	VNJŘ ; na žádost SSV zrušení výluky – změna postupu prací	SSV	BC LiDr
305	25027 E	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1. TK bez TV	29.	8:45-11:45	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ ; na žádost SSV zrušení výluky – změna postupu prací (přesun na prosinec 2023)	SSV	BC LiDr
305	25027 F	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2. TK bez TV	29.	12:00-15:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ ; na žádost SSV zrušení výluky – změna postupu prací (přesun na prosinec 2023)	SSV	BC LiDr

305	25027 G	Lipník nad Bečvou – Drahotuše ZZ – aktivace Odb Jezernice "A"	30.	7:00- 14:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A"	na žádost SSV zrušení výluky – změna postupu prací (přesun na prosinec 2023)	SSV	BC LiDr
-----	---------	--	-----	----------------	---	--	-----	---------

Schvalovatel 2

měsíc: listopad 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23414 B	Opava východ výh. č. 16a/b	22.	9:00- 11:00	výměna vnitřních háků čelistových závěrů výhybky	souběh s ROV 23414 A	OVA	
309	23480 A	Olomouc os. n. SK 111 a 113 bez TV, výh. č. 122	20.11.-N- 4.12.	7:00-N- 17:00	Výměna kol. roštu, úprava GPK, vč. asfaltobetonového povrchu v části 111. SK	požadavek ST Olomouc, odstranění termínovaných závad.	OVA	
309	25029 A	Olomouc – Štěpánov ETCS	18.9.-N-9.12.	19:30- N-24:00	Odstranění havarijního stavu – výpadek sítě GSM- R	Dodatečný požadavek SSZT OLC, odstranění havarijního stavu ETCS – návaznost ROV na nepředpokl. výluky	OVA	
309	53189 P	Rudoltice v Čechách kolejově záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L	15.	7:20- 13:20	podbíjení záhlaví a zhlaví	v souběhu s ROV 53189 J	HKR	
309	53189 R	Rudoltice v Čechách kolejově záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4	16.	7:20- 13:20	podbíjení záhlaví a zhlaví	v souběhu s ROV 53189 K	HKR	
313	23477 A	Senice na Hané – Olomouc hl. n. TK, Senice na Hané záhl. směr Příkazy, Příkazy celá, Olomouc-Řepčín celá, Olomouc-Nová Ulice celá, Olomouc hl. n. záhl. směr Olomouc-Nová Ulice	13.-N-15.	9:00-N- 17:00	rizikové kácení vybraných dřevin, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava průjezdného průřezu, výměna pražců a svařování kolejnic, propracování koleje ASP, úprava km na trati	ZP+ND; požadavek ST Olomouc na odstranění termínovaných závad	OVA	

dílčí změny:								
302	23410 B	Paskov záhl. a zhl. ze směru Vratimov od náv. L po náv. S1	6., 7.	8:00-17:00	Výměna pražců na výhybkách, odstranění defektoskopických vad, oprava výh. č. 5 v ŽST Paskov	na žádost dopravce ČD, a.s. a KODIS úprava času zahájení (původně 7:00-17:00 h)	OVA	
311	23430 A	Šternberk: záhl. směr Bohuňovice. Šternberk – Bohuňovice TK+TV, Bohuňovice: záhl. směr Šternberk.	8.	08:00-16:00	Rizikové kácení a výřez vegetace	ZP+ND; na žádost dopravce ČD a.s. změna času (původně 7:45-16:00 h)	OVA	
311	23430 B	Bohuňovice: záhl. směr Olomouc hl.n.. Bohuňovice – Olomouc hlavní nádraží TK+TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Bohuňovice	7.	08:00-16:00	Rizikové kácení a výřez vegetace	ZP+ND; na žádost dopravce ČD a.s. změna času (původně 7:45-16:00 h)	OVA	
313	23418 A	Senice na Hané – Drahanovice TK Drahanovice celá bez TV, Drahanovice – Třebčín TK	13.	9:00-17:30	Následné propracování TK po opravných pracích na přejezdech	ZP+ND; na žádost GR změna termínu a času výluky pro souběh s ROV 23477 A (původně 9. 11. 2023, 8:00-17:30 h)	OVA	
zrušeno:								
309	23425 A	Blatec SK 3 + TV	24.,25.,26.	8:00-16:00	Oprava napájecího vedení Olomouc – Grygov	ND; na žádost SEE OLC zrušení – práce provedeny v předstihu	OVA	
311	23431 A	Zábřeh na Moravě – Postřelmov TK + TV	27.11.-N-1.12.	8:30-N-19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů km 4,355 (P6654) a 4,569 (P6655), - silniční uzávěra	ZP+ND; na žádost SSZT OLC přesun na rok 2024 - změna postupu prací	OVA	
311	23431 B	Zábřeh na Moravě – Postřelmov: zab. zař.: PZS - (P6654) v km 4,355, (P6655) v km 4,569	27.11.-N-6.12.	8:30-N-19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů km 4,355 (P6654) a 4,569 (P6655)	na žádost SSZT OLC přesun na rok 2024 - změna postupu prací	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: listopad 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
318	33243 A	Velké Pavlovice – Zaječí TK	5./6., 6./7., 7./8., 8./9., 9./10., 12./13., 13./14., 14./15., 15./16.	23:50- 3:40	opravné práce na nadjezdu D2	ZP	CPS	
318	33243 A1	Velké Pavlovice – Zaječí TK	10.-N-11., 16.-N-17.,	23:50- N-6:30	opravné práce na nadjezdu D2	ZP	CPS	
318	33243 A2	Velké Pavlovice – Zaječí TK	11.-N-12., 17.-N-18., 18.-N-19.	23:30- N-8:30	opravné práce na nadjezdu D2	ZP	CPS	
320	33180 G	Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK bez TV, Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK jen TV část od ÚO 421 v km 11,233 do km 74,086	7.11-N-9.12.	16:00 -N- 24:00	modernizační práce na straně ŽSR		ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
320	30005 A	Podivín SK 1 bez TV	10.	7:30- 13:30	odstranění defektoskopických vad, svařování		BNO	
320	33242 A	Modřice záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Rajhrad část od náv. Se4 po náv. Se6	4./5.	21:45- 4:30	navazování srdcovky výhybky č. 2	ovlivnění 2. TK Odb. Rajhrad – Modřice, souběh s výlukou 33156 A	BNO	
320	33242 B	Modřice záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-H. Heršpice část od náv. Se16 po IS mezi vých. č. 25 a 21	5./6.	21:50- 4:40	navazování srdcovky výhybky č. 25	ovlivnění 1. TK Brno-H. Heršpice – Modřice, souběh s výlukou 33156 A	BNO	
323	33019 B	Boří les – Valtice TK	13	8:30- 13:35	oprava GPK ASP	ZP+ND	BNO	
323	33019 C	Valtice – Sedlec u Mikulova – Mikulov na Moravě TK, Sedlec u Mikulova celá	14.	8:10- 13:25	oprava GPK ASP	ZP+ND	BNO	
323	33241 A	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov výhybka č. 3	21.	7:45- 13:00	navazování srdcovky výhybky č. 3	ovlivnění TK Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov – Hevlín	BNO	

324	35025 J	Vlkov u Tišnova sděl. zař.	21.	08:00-13:00	přestěhování výpravního ze stáv. DK do provizorní DK		SSV	Vlkov – Křižanov
502	33231 D	Havlíčkův Brod SK 34 bez TV	20.-N-29.	8:15-N-14:50	souvislá výměna pražců		BNO	
502	33239 A	Okrouhlice zhl., záhl. 1. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. Se8 po nám. výh. č. 10, SK 1 od nám. výh. č. 10 po náv. L1	1.	19:00-21:00	broušení kolejnic km 233,625 - km 233,636		BNO	brousící kampaň
502	33239 B	Světlá nad Sáz. - Okrouhlice 1. TK bez TV, Okrouhlice záhl. 1. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 1S po náv. Se8	1./2.	19:00-05:00	broušení kolejnic km 233,636 - km 238,675		BNO	brousící kampaň
502	33239 C	Světlá nad Sáz. záhl. 1. TK směr Okrouhlice od náv. Se2 po náv. 1L	1./2.	19:00-05:00	broušení kolejnic km 238,675 - km 238,953	ovlivnění 1. TK Světlá nad Sáz. - Okrouhlice	BNO	brousící kampaň
502	33239 D	Světlá nad Sáz. SK 1 od náv. S1 po nám. výh. č. 5, zhl., záhl. 1. TK směr Okrouhlice od nám. výh. č. 5 po náv. Se2	2.	03:00-05:00	obsazení koleje brousící soupravou		BNO	brousící kampaň
502	33239 E	Světlá nad Sáz. zhl., záhl. 1. TK směr Leština u Sv. od náv. Se8 po nám. výh. č. 24, SK 1 od nám. výh. č. 24 po náv. L1	2.	20:00-22:00	obsazení koleje brousící soupravou		BNO	brousící kampaň
502	33239 F	Leština u Sv.- Světlá nad Sáz. 1. TK bez TV, Světlá nad Sáz. záhl. 1. TK od náv. 1S po náv. Se8	2./3., 3./4., 4./5., 5./6.	20:00-05:00	broušení kolejnic km 240,196 - km 250,548		BNO	brousící kampaň
502	33239 F1	Leština u Sv.- Světlá nad Sáz. 1. TK bez TV, Světlá nad Sáz. záhl. 1. TK od náv. 1S po náv. Se8	6./7.	20:00-04:00	broušení kolejnic km 240,196 - km 250,548		BNO	brousící kampaň
502	33239 G	Leština u Sv. záhl. 1. TK od náv. Se1 po náv. 1L	2./3.,3./4., 4./5.,5./6.	20:00-05:00	broušení kolejnic km 250,548 - km 250,837		BNO	brousící kampaň
502	33239 G1	Leština u Sv. záhl. 1. TK od náv. Se1 po náv. 1L	6./7.	20:00-04:00	broušení kolejnic km 250,548 - km 250,837		BNO	brousící kampaň

502	33239 H	Leština u Sv. zhl., záhl. 1. TK směr Světlá nad Sáz. od hrotů jazyků výh. č. 3 po náv. Se1	6./7.	23:00- 4:00	broušení kolejnic km 250,837 - km 251,413		BNO	brousící kampaň
502	33239 I	Okrouhlice SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č. 11, zhl., záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od nám. výh. č. 11 po náv. Se7	7.	19:00- 21:00	broušení kolejnic km 233,612 - km 233,638		BNO	brousící kampaň
502	33239 J	Okrouhlice záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. Se7 po náv. 2S, Okrouhlice - Světlá nad Sáz. 2. TK	7./8.	19:00- 05:00	broušení kolejnic km 233,638 - km 238,675		BNO	brousící kampaň
502	33239 J1	Okrouhlice záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. Se7 po náv. 2S, Okrouhlice - Světlá nad Sáz. 2. TK	8.	19:00- 22:00	broušení kolejnic km 233,638 - km 238,675		BNO	brousící kampaň
502	33239 K	Světlá nad Sáz. záhl. 2. TK směr Okrouhlice od náv. 2L po náv. Se1	7./8.	19:00- 05:00	broušení kolejnic km 238,675 - km 238,936		BNO	brousící kampaň
502	33239 K1	Světlá nad Sáz. záhl. 2. TK směr Okrouhlice od náv. 2L po náv. Se1	8.	19:00- 22:00	broušení kolejnic km 238,675 - km 238,936		BNO	brousící kampaň
502	33239 L	Světlá nad Sáz. záhl., zhl. 2.TK směr Okrouhlice od náv. Se1 po nám. výh.č.6, SK 2 od nám. výh. č. 6 po náv. S2	8.	21:00- 22:00	obsazení koleje brousící soupravou		BNO	brousící kampaň
502	33239 M	Světlá nad Sáz. SK 2 od náv. L2 po nám. výh. č.21, zhl. SK 2 směr Leština u Sv. od nám. výh. č.21 po náv. Se9	8./9.	22:00- 04:00	broušení kolejnic km 240,196 - km 240,197		BNO	brousící kampaň
502	33239 N	Světlá nad Sáz. záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od náv. Se9 po náv. 2S, Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK bez TV	8./9.	22:00- 04:00	broušení kolejnic km 240,197 - km 250,548		BNO	brousící kampaň

502	33239 N1	Světlá nad Sáz. záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od náv. Se9 po náv. 2S, Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK bez TV	10./11., 16./17., 17./18., 18./19.	20:00-05:00	broušení kolejnic km 240,197 - km 250,548		BNO	brousící kampaň
502	33239 N2	Světlá nad Sáz. záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od náv. Se9 po náv. 2S, Světlá nad Sáz. - Leština u Sv. 2. TK bez TV	9./10.	20:00-04:00	broušení kolejnic km 240,197 - km 250,548		BNO	brousící kampaň
502	33239 O	Leština u Sv. záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 2L po náv. Se2	8./9.	22:00-04:00	broušení kolejnic km 250,548 - km 250,837		BNO	brousící kampaň
502	33239 O1	Leština u Sv. záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 2L po náv. Se2	10./11., 16./17., 17./18., 18./19.	20:00-05:00	broušení kolejnic km 250,548 - km 250,837		BNO	brousící kampaň
502	33239 O2	Leština u Sv. záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 2L po náv. Se2	9./10.	20:00-04:00	broušení kolejnic km 250,548 - km 250,837		BNO	brousící kampaň
502	33239 P	Leština u Sv. záhl., zhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. 2L po hroty jazyků výh. č. 4, SK 2, 2a, 2b, 2c, záhl., zhl. 2. TK směr Vlkaneč od nám. výh. č. 16 po náv. Se13	13./14.	20:00-05:00	broušení kolejnic km 250,412 - km 251,671; km 252,219 - km 252,240	ovlivnění 2. TK Světlá nad Sáz. - Leština u Sv.	BNO	brousící kampaň
502	33239 R	Leština u Sv. záhl. 2. TK směr Vlkaneč od náv. Se13 po náv. 2S, Leština u Sv. - Vlkaneč 2. TK	13./14., 14./15.	20:00-05:00	broušení kolejnic km 250,240 - km 255,859		BNO	brousící kampaň
502	33239 R1	Leština u Sv. záhl. 2. TK směr Vlkaneč od náv. Se13 po náv. 2S, Leština u Sv. - Vlkaneč 2. TK	15.	20:00-22:00	broušení kolejnic km 250,240 - km 255,859		BNO	brousící kampaň
502	33239 S	Vlkaneč záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od náv. 2L po náv. Se3	13./14., 14./15.	20:00-05:00	obsazení koleje brousící soupravou		BNO	brousící kampaň
502	33239 S1	Vlkaneč záhl. 2. TK směr Leština u Sv. od náv. 2L po náv. Se3	15.	20:00-22:00	obsazení koleje brousící soupravou		BNO	brousící kampaň

502	33239 T	Vlkaneč záhl. 1. TK směr Leština u Sv. od náv. Se1 po náv. 1L, Vlkaneč – Leština u Sv. 1. TK bez TV	15./16.	22:00-05:00	broušení kolejnic km 252,724 - km 255,856		BNO	brousící kampaň
502	33239 U	Leština u Sv. záhl. 1. TK směr Vlkaneč od náv. 1S po náv. Se12	15./16.	22:00-05:00	obsazení koleje brousící soupravou		BNO	brousící kampaň
502	33329 V	Leština u Sv. zhl, záhl. 2. TK směr Světlá nad Sáz. od náv. Se2 po hroty jazyků výh. č. 4	18./19.	23:00-5:00	broušení kolejnic km 250,837 - km 251,419		BNO	brousící kampaň
507	35012 A	Rozsochatec SZZ	21.	9:00-18:00	výměna SW z důvodu zřízení DOZZ v úseku H. Brod – Hlinsko v Č.	výměna SW ve vlakové přestávce, jízdy na PN, Op	BNO	
507	35012 B	Havlíčkův Brod – Rozsochatec TZZ	21.,22.	9:00-18:00	úpravy TZZ z důvodu zřízení DOZZ v úseku H. Brod – Hlinsko v Č.	úpravy TZZ ve vlakové přestávce, jízdy na PN, Op	BNO	
507	35012 C	Rozsochatec – Chotěboř TZZ	21.,22.	9:00-18:00	úpravy TZZ z důvodu zřízení DOZZ v úseku H. Brod – Hlinsko v Č.	úpravy TZZ ve vlakové přestávce	BNO	
507	35012 D	Chotěboř SZZ	22.	9:00-18:00	výměna SW z důvodu zřízení DOZZ v úseku H. Brod – Hlinsko v Č.	výměna SW ve vlakové přestávce, jízdy na PN, Op	BNO	
507	35012 E	Ždírec nad Doubravou SZZ	23.	9:00-18:00	výměna SW z důvodu zřízení DOZZ v úseku H. Brod – Hlinsko v Č.	výměna SW ve vlakové přestávce, jízdy na PN, Op	BNO	
dílčí změny:								
320	33180 D	Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK+TV	25.10.-N-7.11.	16:45 -N- 16:00	modernizační práce	změna termínu ukončení (pův. 9.12.2023 do 23:59 hod.), po ukončení et. D bude pro moder. práce na straně ŽSR zahájena etapa G, změna rozsahu výluky napětí TV	SSV + ŽSR	Lanžhot – Lanžhot st.hr., Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.

324	35025 A	Vlkov u Tišnova SZZ	8.-N-20.	8:00-N-17:00	postupné přepínání výhybek a návěstidel na ovládání z JOP	změna termínu ukončení (pův. 16.11.)	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35025 B	Vlkov u Tišnova – Řikonín TZZ 1. a 2. TK	8.-N-20.	8:00-N-17:00	přepínání vazeb AB na ovládání z JOP	VNJŘ+ND změna def. vyloučeného úseku doplněno TZZ 2. TK, změna času (pův. 8:00-15:00 hod.)	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35025 F	Vlkov u Tišnova – Řikonín 1. TK bez TV	20.	8:00-12:30	zkouška kódování VZ	VNJŘ+ND změna času (pův. 13:00-15:00 hod.)	SSV	Vlkov – Křižanov
324	35025 G	Řikonín – Vlkov u Tišnova 2. TK bez TV	20.	12:30-17:00	zkouška kódování VZ	VNJŘ+ND změna času (pův. 15:00-17:00 hod.)	SSV	Vlkov – Křižanov
502	33187 A	Golčův Jeníkov – Vlkaneč 1. TK+TV, Vlkaneč lichá jen TV	30.	7:55-16:10	čištění zbahnělého lože, úprava GPK, údržba TV	NVÚ změna termínu (pův. 16.11.), nevhodný souběh s ROV 33220 B	BNO	
502	33220 B	Leština u Sv. SK 2, 2a, 2b, 2c, 4, výh. č. 6, zhl., záhl. 2. TK směr Vlkaneč od nám. výh. č. 14 a 16 po náv. 2S, sudá jen TV, Leština u Sv. - Vlkaneč 2. TK+TV	16.-N-20.	7:45-N-16:10	výměna výhybkových pražců ve výh. č. 6, 16, 18, 20, úprava GPK, doplnění a úprava šterkového lože	NVÚ změna termínu zahájení (pův. 17.11.), navýšení rozsahu prací	BNO	
zrušeno:								
324	35025 C	Řikonín – Vlkov u Tišnova TZZ 2. TK	8.-N-20.	8:00-N-17:00	postupné přepínání výhybek a návěstidel na ovládání z JOP	vylouč. zařízení doplněno do etapy B	SSV	Vlkov – Křižanov

Schvalovatel 4

měsíc: listopad 2023

datum: 29.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	63042 C	SpS Poříčany	22.11.	7:00-13:00	údržba NS	R3	PHA	
501	50018 A	Pardubice hl.n. kolejově 95. spojovací kolej	13.11.-N-2.12	9:00-N-18:00	oprava kolejové váhy	dodatečné finanční prostředky	HKR	
513	53216 B	Častolovice – Rychnov n. Kn.: TK; Rychnov n. Kn.: celá	13., 14., 15., 16.	7:20-16:20	kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva	ZP+ND; v souběhu s ROV 53216 A	HKR	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: listopad 2023

datum: 29.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
515	63233 A	Kolín-Ratboř-Bečváry TK	20.-N-24.	8:00-N-17:00	doplnění ŠL, podbití, výřez	ZP+ND, nezajištění ND 2.-6.10	PHA	
516	33195 A	Ledeč n/S-Vlastějovice TK	27.-30.	7:10-13:50	výměna DVK, údržba ŽS, výřez vegetace	ZP+ND, nezajištění ND 16.-19.10	BNO	
519	63266 K	Benešov u Prahy DKS 901	18./19.	21:35-5:00	broušení, navařování	ZP+ND, (Benešov-Čerčany)	PHA	
519	63266 H	Benešov u Prahy výh. č. 9, 10	20./21	21:40-5:00	navazování srdcovek	nelze lichá od Olbramovic	PHA	
519	63266 L	Čerčany-Benešov u Prahy 1. TK, Čerčany záhl., zhlaví od nám. výh. č. 1 po náv. 1L, Benešov u P. záhl., zhlaví od náv. 1S po nám. výh. č. 42	21./22.	21:30-5:00	broušení, navařování výh. č. 1, 42		PHA	
519	63271 A	Strančice TV lichá	20./21.,21./22.	23:10-5:10	čištění a údržba nadchodu	NVÚ	PHA	

519	63266 M	Benešov u Prahy výh. č. 43	22./23.	21:30-5:00	broušení, navařování	nelze jezdit Benešov u P.-Čerčany 2. TK	PHA	
519	63266 N	Benešov u Prahy výh. č. 5	23./24.	22:45-5:00	navazování srdcovky		PHA	
519	63271 B	Strančice TV sudá	22./23.,23./24.	23:10-5:10	čištění a údržba nadchodu	NVÚ	PHA	
519	63266 I	Benešov u Prahy výh. č. 35, 37, 40	25.	8:40-18:40	broušení, navařování	nelze lichá od Čerčan	PHA	
519	63266 J	Benešov u Prahy výh. č. 36, 38, 41	26.	8:40-18:40	broušení, navařování	nelze sudá od Čerčan	PHA	
519	63266 P	Čerčany výh. č. 3, 5	28./29.	22:20-4:00	navazování srdcovek	nelze lichá od Benešova	PHA	
519	63266 R	Čerčany výh. č. 4, 6	29./30.	22:20-5:00	navazování srdcovek	nelze sudá od Benešova	PHA	
521	63180 A6	P.Smích. -odb.Závodiště 1., 2. TK+TV	18.,19.	10:00-15:00	dmt říms	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 E3	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	13.-16., 20.-24., 27.-30.	8:30-18:30	stavba TZ	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 O	P.Krč 2. SK+TV 1., 1a, 1b, 2., 3. SK	20.11.-N-9.12.	17:30 -N-24:00	stavba kabelovodu	NVÚ	SSZ	Branický most
524	63161 T9	P.Vysočany-vých.Skály 1. TK, vých. Skály 1. SK	16.-N-17.	20:40 -N-21:15	ASP, ŠL, GPK	do ZP vých.Skály-Čelákovice	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 X	vých.Skály-P.Vysočany 0. TK, vých.Skály vysočanské a počernické záhl., zhlaví od OS,OL po Se5	16.-N-17.	20:40 -N-21:15	ASP, ŠL, GPK		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 Z	P.Vysočany TV celá	16.-N-20.	20:40 -N-4:20	dmt starých TZ	LNT	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63234 O	P.Vysočany lichá+zhlaví po Se16	16.-N-18.	20:40 -N-5:00	dmt starých TZ, pískování nástupišť		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 W	vých.Skály-P.Vysočany 2. TK, vých.Skály 2., 4. SK	18.-N-20.	5:00 -N-4:20	ASP, ŠL, GPK		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 H	vých.Skály-P.Vysočany 0. TK, vých.Skály vys. záhl., zhlaví po Se7	18.-N-20.	5:00 -N-4:20	ASP, ŠL, GPK		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63234 P	P.Vysočany 0., 2., 4. SK+skalské a balabenské záhlaví a zhlaví	18.-N-20.	5:00 -N-4:20	dmt starých TZ, pískování nástupišť	do ZP+ND vých.Skály-Čelákovice	SSZ	Vysočany-Mstětice

524	63234 R	odb.Balabenka-P.Vysočany 301. TK	18.-N-20.	5:00 -N- 4:20	dmt starých TZ		SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63161 T	P.Vysočany-vých.Skály 1. TK, vých.Skály 1. SK	24.-N-27.	20:40 -N- 4:20	ASP, ŠL, GPK	do ZP+ND vých.Skály- Čelákovice	SSZ	Vysočany-Mstětice
524	63132 A2	Lysá n/L-Milovice TK+TV, Milovice celá+TV	25.,26.	8:00- 16:00	výměna DVK, údržba ŽS, výřez vegetace, oprava vých. č. 1	do ZP+ND vých.Skály- Čelákovice	PHA	
525	63180 J1	P.Vršovice-P.ONJ TK+TV	7.-12.	7:30- 17:30	stavba TZ	ZP	SSZ	Branický most
525	63245 C	P.Malešice vých. č. 8	25.-N-26.	8:00- N- 16:00	výměna srdcovky, vých. součástí, výměna pražců, regulace chodu		PHA	
526	63009 A2	P.Mas.n.-Slun.-odb.Balab. 402. TK, +TV 402.,301., 501.TK	1./2.	22:00- 5:30	stavba TS 51A, 55A, 55B, mt ÚO 202	ZP P.Holešovice- P.Mas.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 B2	P.Mas.n.-Slun.-odb.Bal. 401. TK+TV	2./3.	22:00- 5:30	stavba TS 56A, 56B		SSZ	NS Balabenka
526	63009 A3	P.Mas.n.-Slun.-odb.Balab. 402. TK, +TV 402., 301., 501. TK	3./4.	23:40- 4:20	mt NP 55A/56A, 55B/56B	ZP P.Holešovice- P.Mas.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 B3	P.Mas.n.-Slun.-odb.Bal. 401. TK+TV	3./4.	23:40- 4:20	mt NP 55A/56A, 55B/56B	ZP P.Vysočany- P.Mas.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 C3	odb.Bal.-Praha hl.n. 302T TK+TV, odb.Bal.-P.Vysočany 301K TK+TV	3./4.	23:40- 4:20	výstroj TS 76, 78, mt NP 75/76, 77/78	ZP P.Holešovice- Praha hl.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 I3	P.Vysočany-odb.Bal. 302K TK+TV	3./4.	23:40- 4:20	výstroj TS 76, 78, mt NP 75/76, 77/78	ZP P.Vysočany- Praha hl.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 D3	P.Liběň-P.Mas.n.-Sluncová 201./201a TK+TV	4./5., 6./7.	23:40- 4:20	mt NP N1/N2		SSZ	NS Balabenka
526	63009 E3	P.hl.n.-P.Liběň 601./601a TK+TV	4./5., 6./7.	23:40- 4:20	mt NP N1/N2		SSZ	NS Balabenka
526	63009 F3	P.Liběň-P.hl.n. 602./602a TK+TV	4./5.	23:40- 4:20	mt NP N1/N2	ZP P.Liběň-Praha hl.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 G3	P.Liběň-P.Mas.n.-Sluncová 202./202a TK+TV	4./5., 7./8., 8./9.	23:40- 4:20	mt NP N1/N2, výstroj/výměna TS N1, N3, N5, N7	ZP P.Liběň- P.Mas.n.	SSZ	NS Balabenka
526	63009 D2	P.Liběň-P.Mas.n.-Sluncová 201./201a TK+TV	5./6., 7./8., 8./9.	22:00- 5:30	mt NP N7/N8, výstroj/výměna TS N1, N3, N5, N7		SSZ	NS Balabenka

526	63009 E2	P.hl.n.-P.Liběň 601./601a TK+TV	5./6.	22:00- 5:30	výstroj/výměna TS N1, N7	VNJŘ	SSZ	NS Balabenka
526	63009 F2	P.Liběň-P.hl.n. 602./602a TK+TV	7./8., 8./9.	22:00- 5:30	výstroj/výměna TS N3, N5	VNJŘ	SSZ	NS Balabenka
526	63009 H3	odb.Bal.-P.Mas.n.-Slun. 402. TK+TV	7./8.	23:40- 4:20	úprava ÚO 202A	ZP P.Mas.n.- P.Vysočany	SSZ	NS Balabenka
537	63161 Y	P.Satalice-vých.Skály TK	17./18.	21:15- 5:00	ASP, ŠL, GPK	ZP+ND	SSZ	Vysočany-Mstětice
704	63266 O	Benešov u P.-Olbramovice 1. TK, Benešov u P. záhl. Od S1a po 1L, Olbram. záhl. Sc1b po vých. č. 23	27./28.	21:45- 5:10	broušení, navazování vých. č. 1, 23		PHA	
dílčí změny:								
523	63180 I2	P.Braník-P.Krč TK, P.Krč záhlaví od náv. L po náv. Se4	30.11./1.12.	22:20- 4:30	skládka kolejnic	ZP+ND, přesun z 29./30.11.	SSZ	Branický most
zrušeno:								
521	63180 D,P	odb.Záv.-odb.Tunel 3., 4. TK+TV, odb.Tunel-P.Krč TK+TV, P.Krč TV celá	4.11.-N-9.12.	0:00 -N- 24:00	zdvoukolejnění tratě, oprava mostu v km 9,680	ZP, posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
521	63180 F	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	4.11.-N-9.12.	6:00 -N- 24:00	budování odb. Spořilov a zastávky Kačerov	ZP, posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
521	63180 V	P.Krč-P.Z.Město TV TK od ÚO 406 P.Z.M po mech.dělení v km 2,647	4.11.-N-23.11.	6:00 -N- 17:30	TSO	posun zahájení investiční akce	PHA	
521	63180 K	P.Z.Město 302., 305c, 307c SK +TV 302., 303.-309. SK	4.11.-N-23.11.	6:00 -N- 17:30	TSO	NVÚ, posun zahájení investiční akce	PHA	
523	63180 E	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	16.-N-30.	7:30 -N- 17:30	SČ+SVK km 2,250-2,600	posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
523	63180 L	P.Krč branické záhlaví a zhlaví od náv. L po náv. č. 2, náv. S1, S4, S6	16.11.-N-1.12.	7:30 -N- 17:30	TSO křížení 901	ZP+ND, posun zahájení investiční akce	PHA	
523	63180 M	PKrč 1a SK	16.11.-N-1.12.	7:30 -N- 17:30	TSO křížení 901	posun zahájení investiční akce	PHA	
523	63180 I2	P.Braník-P.Krč TK, P.Krč záhlaví od náv. L po náv. Se4	28./29.	22:20- 4:30	skládka kolejnic	ZP+ND	SSZ	Branický most

Schvalovatel 6

měsíc: listopad 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63263 A1	Karlštejn – Beroun 2. TK + TV	5.-17.	8:30-18:30	terénní úpravy	VNJŘ+ND	SSZ	BERKA
521	63042 J	NS Karlštejn	15.,16.	7:00-13:00	R22kV, R3kV	E	PHA	
521	63042 V	NS Beroun	23.	7:00-13:00	R22kV	E	PHA	
708	93160 A	Prachatice – Chroboly TK, Prachatice lázně celá dopravna	7.11.-N-6.12.	8:00 -N-16:00	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním a zřizováním BK v obloucích malých poloměrů, výměny přejezdových konstrukcí, odstranění zavedených PJ	ZP+ND	PLZ	
708	93160 B	Chroboly – Zbytiny TK, Chroboly záhlaví směr Zbytiny, Zbytiny záhlaví směr Chroboly	13.,14.,15.	9:25-14:40	údržba průjezdného průřezu, úprava rozhledových poměrů u železničních přejezdů, kácení stromů	ZP+ND v souběhu s ROV 93160 A, náhrada za zrušené výluky v prosinci	PLZ	
709	93170 A	Plzeň hl.n. – Plzeň-Koterov 1. TK + TV	20.,21.	7:25-13:25	montáž protidotekových zábran na silničním nadjezdu		SSZ	LOKO
709	93170 B	Plzeň-Koterov – Plzeň hl.n. 2. TK + TV	22.,23.	7:25-13:25	montáž protidotekových zábran na silničním nadjezdu		SSZ	LOKO
710	93173 A1	Běšiny – Klatovy TK	29./30. 30.11./1.12	20:25-4:30	snesení podsukružení silničního mostu "Silnice I/27 - přeložka Klatovy"	ZP	CPS	
713	931164 D	Ejpvovice výhybka č. 1 od hrotu výhybky č. 1 k námezníkům výhybek č. 1 a 2	2./3.	20:00-5:00	navažení DV srdcovky	VNJŘ jednokolejný provoz v úseku Ejpvovice – Rokycany	PLZ	
713	93164 F	Ejpvovice výhybka č. 8 od hrotu výhybky č. 8 k námezníkům výhybek č. 8 a 7	2./3.	20:00-5:00	navažení DV srdcovky	VNJŘ jednokolejný provoz v úseku Ejpvovice – Plzeň hl.n.	PLZ	

713	93164 E	Ejpovice výhybka č. 7 od hrotu výhybky č. 7 k námezníkům výhybek č. 7 a 8	3./4.	21:00-6:00	navažení DV srdcovky	VNJŘ jednokolejný provoz v úseku Rokycany – Ejpovice – Plzeň hl. n.	PLZ	
720	93172 A	Kozolupy zhlaví směr Plzeň-Křimice od návěstidel S1, S3 k námezníkovi výhybky č. 5	11.	7:00-17:00	navažení srdcovky DV výh. č. 5		PLZ	
dílčí změny:								
713	93115 D2	Kařízek – Holoubkov 2. TK + TV	13.-N-14.	7:10 -N- 14:30	převěšení TV	původně ve dnech 18.-19.11.2023	SSZ	TT Mýto
713	93115 E2	Holoubkov – Kařízek 1. TK + TV	15.-N-16.	7:10 -N- 14:30	převěšení TV	původně ve dnech 25.-26.11.2023	SSZ	TT Mýto
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 7

měsíc: listopad 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
502	63246 B	Odb. Babín – obě přilehlá záhlaví, výhybky č. 2, 3, 4 v Odb. Babín	19.	8:30-18:30	cyklická výměna výh. dílů výhybka č. 2, 3, 4 Odb. Babín.	VNJŘ pův. et. C, na žádost místní technologie, upřesnění vyloučení	PHA	
502	65023 A	NBK seř.n. KB 224, 225, 324, 325	14.-N-1.12.	8:00 -N- 18:00	Demontáž KB, montáž PHB, sanace žel. svršku, přezkoušení.		PHA	
503	73226 A1	V. Žernoseky – Litoměřice 1. TK+TV	13./14.,14./15., 27./28.,28./29., 29./30., 30.11./1.12.	23:35-4:35	sypání šterku, výstavba TP, převěšení a regulace TV	ZP	SSZ	Litoměřice – Žernoseky
503	73414 A	Děčín hl.n. 114. SK	27.11.-N-6.12.	7:00 -N- 17:00	výměna prazců ve 114. SK	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
527	75027 A	Hněvice SZZ	1.	0:00-2:00	výměna softwaru		CPS	

527	75027 B	Hněvice celá dopravna	1.	0:00-2:00	výměna softwaru	ZP operativně 30'	CPS	
527	73376 G	Hněvice 2c jen TV + výh. č. 30, 31	14.	7:00-16:00	výměna jazyka a opornice a čelistových závěrů výh. č. 30, svařování		UNL	
527	73295 C	Lovosice 1. SK+TV nad 1., 1a, 3., 7a, 9., 101. SK	3./4.,5./6., 7./8.,9./10.	21:00-5:00	odvoz materiálu, propojení kabelovodu 495,004	NVÚ	SSZ	Podchod Lovosice
537	63176 A	Všetaty - Ml. Boleslav hl.n. TK, včetně dopraven	6.-N-10.	8:35 -N- 17:20	odstranění def. vad, svařování, oprava PZS km 42,169., 50,396, 46,546	ZP+ND. Přesun z 10 /23, nezajištění ND	PHA	požadavek ČD
537	63176 B	Neratovice+ Neratovice-Všetaty TK	6., 7., 8.	10:20 - 17:45	výměna pražců a kolejnic, podbíjení	ZP+ND. Přesun z října 9., 10., 11. 10.	PHA	požadavek ČD
537	63176 C	Neratovice výh. č. 106	6., 7., 8., 9.	10:05 - 17:45	výměna pražců a kolejnic, podbíjení	Přesun z října 9., 10., 11., 12. 10.	PHA	požadavek ČD
537	63247 A	Loukov u M.H.-kolejově celá	17.-N-19.11.	7:00 -N- 18:00	oprava P2718 (km 96,123) výměna přejezdové konstrukce, úprava GPK v dopravně Loukov	ZP+ND, v souběhu s ROV 63176 +63211.	PHA	
539	73422 A	Lovosice – Žalhostice TK Žalhostice záhl.	20.	8:00 - 16:00	strojní úprava GPK	ZP, ND s dopravci a s PO UNL projednáno	UNL	
546	73353 D	Rumburk šluknovské zhlaví 3. SK výh. č. 3, 4ab, 5	1.	8:00-14:00	defektoskopické vady – navaření srdcovek výh. č. 4ab	ZP+ND není možná jízda Rumburk – Šluknov	UNL	
dílčí změny:								
502	63246 B	Odb. Babín – obě přilehlá záhlaví, výhybky č. 2, 3, 4 v Odb. Babín	17.,18.	8:30-18:30	cyklická výměna výh. dílů výhybka č. 2, 3, 4 Odb. Babín	VNJŘ žádost technologie, upřesnění vyloučení přesun z 25., 26.11.	PHA	
502	63246 D	NBK hl.n. výhybky č. 36, 38, 39	13.-N-16.	7:00 -N- 15:00	oprava výhybek	žádost technologie, upřesnění vyloučení	PHA	

503	73323 A	Děčín východ 2. SK + TV	27.11.-N-1.12.	7:00-N-17:00	odstranění blátivých míst, výměna pražců, strojní úprava GPK	původně v termínu 6.-10.11. kapacitní důvody NVÚ	UNL	
527	73376 D	D. Beřkovice – Hněvice 2. TK+TV Hněvice 2. SK záhl. a zhl. D. Beřkovice záhl.	8.	7:00-16:00	odstranění porostu, strojní úprava GPK a GP výh. č. 3, 4, 5, 6	Původně bez 2. SK a zhlaví v ŽST Hněvice	UNL	
527	73295 I	Lovosice prrackovické zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 22	13.-N-17.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 17	původně 30.10.-3.11. posun z důvodu překročení výluky dle ROV 73201 A	UNL	
539	73337 A	Čížkovice – Libochovice TK	30.	7:00-17:30	strojní podbíjení styků, odstranění porostu	ZP+ND, původně v termínu 14.-16.11. kapacitní důvody sekačky	UNL	
537	63177 A	MB hl.n. záhl. a zhl směr MB-Debř, MBm., MB hl.n. SK 5c	16.-N-20.	23:00-N-6:00	oprava výh. č. 33, 35	ZP+ND, úprava času zahájení výluky (původně od 22:00 hodin) a upřesnění vyloučení, v souběhu s 63211	PHA	
542	63177 B	MB hl.n-MBm. TK, MB m. záhl. a zhl. Směr MB hl.n., MB m. SK 1c, 1d SK	18.,19.	8:00-16:00	doplnění ŠL, úprava GPK strojně	ZP+ND, upřesnění vyloučení, v souběhu s 63211	PHA	
542	63177 C	MB m. zhl. Směr MB hl.n, MB m. SK 1. a 3, od nám. výh. 1 po S1, S3	18.-N-19.	8:00-N-16:00	výměna výh. dílů ve výhybce č. 1, výměna pražců, doplnění ŠL, podbití, svařování	ZP+ND, upřesnění vyloučení, v souběhu s 63211	PHA	
zrušeno:								
502	63246 C	Odb. Babín – obě přilehlá záhlaví, výhybky č. 2, 3, 4 v Odb. Babín	27.	8:30-18:30	cyklická výměna výh. dílů výhybka č. 2, 3, 4 Odb. Babín	práce budou vykonány v etapě B, na žádost technologie, upřesnění vyloučení	PHA	
503	63092 C1	Dřísy 1. + 3. SK, TV lichá	25., 26., 29.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun na prosinec	PHA	
503	63092 E1	Všetaty – Dřísy 1. TK + TV	25., 26.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun na prosinec	PHA	

503	63092 B1	St. Boleslav – Dřísy 2. + TV	27., 28.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun na prosinec	PHA	
503	63092 G1	Dřísy zhl. St. Bol.	27., 28.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun na prosinec	PHA	
503	63092 D1	Dřísy 2. + 4., TV sudá	27., 28.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun na prosinec	PHA	
503	63092 A1	Dřísy - St. Boleslav 1. + TV	29.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun na prosinec	PHA	
527	73379 F	UL sever 201. SK, výh. č. 246	14.	7:30-14:00	navazování srdcovky výh. č. 246	rozvoj vady – srdcovka vyměněna v nepředpokládané výluce	UNL	
541	53204 A	Městec Králové: SK č. 1, výh. 2, její část od námezníku po námezník výh. 1	27.-N-30.	8:00-N-16:00	oprava výhybky č. 2	změna priorit	HKR	
546	75022 A	Č. Kamenice – Mlýny TZZ, PZS v km 26,817 (P2611) a PZM v km 27,393 (P2612), v km 27,777 (P2613) a v km 28,624 (P2614)	13.-N-16.	8:00-N-15:00	vypnutí PZS, výměna technologie PZS, zapnutí a přezkoušení nového PZS	přesun do prosince z důvodu průtahů při zajišťování podkladů pro stavební povolení	UNL	
546	75022 B	Benešov n. Pl. - Markvartice TZZ a PZS v km 13,141 (P2586)	15.	8:00-17:00	vypnutí PZS, demontáž a výměna závorových stojanů PZS, zapnutí a přezkoušení nového PZS	přesun do prosince z důvodu průtahů při zajišťování podkladů pro stavební povolení	UNL	

Schvalovatel 8

měsíc: listopad 2023

datum: 02.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73410 A	UL západ zhlaví střední 57. a 59. SK + výh. č. 148, 152, 153, 158ab, 57. SK + TV	1.-N-5.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 148, 152, výh. č. 153 nahrazení kolejovým polem, výh. č. 158ab nahrazení jednoduchou výh., cyklické broušení výh. č. 148, 152	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
504	73410 B	UL západ zhlaví střední 61.-71. SK + výh. č. 156, 160, 162, 164, 167	1.-N-7.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 162, 164, 167 výh. č. 156 nahrazení kolejovým polem, cyklické broušení výh. č. 160, 162, 164, 167	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
504	73410 C	UL západ zhlaví střední 73.-83. SK + výh. č. 166, 170, 171, 175, 176	8.-N-15.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 170, 171, 175, 176, cyklické broušení výh. č. 170, 171, 175, 176	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
504	73410 D	UL západ střední zhlaví 85. SK + výh. č. 158ab, 159, 161	13.-N-15.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 159, 161, cyklické broušení výh. č. 159, 161	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
504	73410 E	UL západ zhlaví střední 85.-93. SK + výh. č. 159, 161, 165, 168, 169	16.-N-20.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 161, 165, 168, 169, cyklické broušení výh. č. 165, 169, 168	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
504	73410 F	UL západ zhl. stř 95,-97d SK, 97e SK + výh. č. 177, 180, 182, 183, 186, 187	21.-N-27.	7:00 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 177, 180, 182, 183, 186, 187, cyklické broušení výh. č. 177, 180	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
504	73412 A	UL západ výh. č. 78	1.,2.	8:00- 15:00	výměna jazyků a opornic, dotahování upevňovadel, oprava GPK ve výh. č. 78, svařování	ovlivnění OKV	UNL	
504	73252 D	Teplice v Č. 1. nástupiště u 3. staniční koleje	30.9-N-30.11.	17:00 -N- 17:00	rekonstrukce 1. nástupiště u 3. staniční koleje oprava přístřešků na nástupišti	navazuje na vyluku B	SSZ	

504	73327 D	Řehlovice 2.,4. SK+TV zhl. SK č. 2, 4 směr Trmice a Úpořiny - část od izol. styku mezi výh. č. 4-5 po izol. styk mezi výh. č. 11-13	10.-N-13.	7:30 -N- 17:00	výměna pražců ve výh. č. 113, oprava GP	NVÚ	UNL	
504	73418 B	Řehlovice – Úpořiny 2. TK Řehlovice záhl. Úpořiny záhl.	31.10./1.11.	20:00- 5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73418 C	Světec – Ohníč 1. TK Světec záhl. Ohníč záhl.	1./2.	20:00- 5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73413 A	Ohníč zhl. úpořinské 2. SK mezi náv. Se2 – S2	13.	7:30- 16:00	výměna srdcovky výh. č. 4, svařování	ovlivnění 2. TK Úpořiny – Ohníč	UNL	
504	73424 A	Světec záhlaví a zhlaví koleje č. 2 směr Bílina mezi návěstidly L2 – Se21	24.	7:15- 15:30	navazování srdcovky výhybky č. 33ab	ovlivnění 2. TK Světec – Bílina	UNL	
504	73424 B	Světec 1. SK, záhlaví a zhlaví koleje č. 1 směr Bílina a ohničské zhlaví 1. staniční koleje – část po návěstidlo Se5	25.	7:15- 15:30	navazování srdcovek výhybek č. 6, 34	ovlivnění 1. TK Bílina – Světec	UNL	
504	73424 C	Ohníč – Světec 2. TK; Světec záhlaví a zhlaví koleje č. 2 směr Ohníč – část po návěstidlo S2	27.	7:10- 16:00	navazování srdcovky výhybky č. 2, údržba odvodnění		UNL	
504	73420 A	Most n. n. odjezd. 21., 22., 23. SK + TV nad 19., 20., 21., 22., 23. SK	1.-N-21.	8:00 -N- 17:00	TSO staniční koleje č. 22, 23	NVÚ dodatečný přiděl financí	UNL	
504	73423 A	Chomutov výh. č. 70	20.	8:00- 12:00	oprava výh. č. 70	ovlivnění 1. TK Odb Dubina – Chomutov	UNL	
529	73342 A	Klobuky – Peruc – Vrbno n. L. - Chlumčany u L. - Louny TK včetně všech dopraven	6.-N-10.	7:00 -N- 19:00	oprava GPK, svařování, oprava nástupiště u 1. SK Peruc, navazování srdcovek výh. č. 2, 5, 6 Vrbno n.L. + výh. č. 3 Chlumčany u L.	ZP+ND, přesun z října na žádost ČD a.s. nebylo možno sehnat NAD	UNL	
529	65021 A	Zlonice SZZ	27.11.-N-8.12	8:00 -N- 15:00	úpravy na ZZ pro zavedení VDS	telef. dorozumívání, jízdy na PN	PHA	

529	65021 C	Zlonice PZZ P2138 v km 64,917	27.11.-N-1.12.	8:00 -N- 15:00	přemístění závorových pohonů s výstražníky do nových poloh, doplnění reléových obvodů o nové prvky pro automatickou činnost PZZ		PHA	
531	73417 A	Hořetice – Březno u Ch. TK Hořetice záhl.	11./12.	22:35- 5:00	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73417 B	Hořetice – Březno u Ch. TK	12./13.,13./14., 14./15.,15./16., 16./17.	22:35- 5:00	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73417 C	Hořetice – Březno u Ch. TK Březno u Ch. záhl.	24./25.	22:35- 5:00	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73417 D	Žatec-Velichov – Hořetice	25./26.,26./27.	22:35- 5:00	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73417 E	Březno u Ch. - Droužkovice TK Březno u Ch. záhl.	27./28.	22:35- 5:00	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73417 F	Droužkovice – Chomutov TK Chomutov záhl.	28./29	22:35- 5:30	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73417 G	Droužkovice – Chomutov TK	29./30., 30.11./1.12.	22:35- 5:30	broušení kolejnic	ZP	UNL	
531	73419 A	Žatec záp. - Žatec-Velichov 902b spojovací kolej od hrotů jazyků výh. č. 201 po náv. Se202 + TV od ÚO 441 směr Žabokliky, Žatec záp. 202., 204. SK + TV nad 202., 204., 206., 208. SK, směr Žatec obvod Velichov, zhl. od nám. výh. č. 207, 208, 211 po hroty jazyků výh. č. 201	6.-10.,13.-16., 20.-24.	7:30- 16:30	čištění odvodnění	ZP	UNL	
531	73419 B	Žatec záp. - Žatec-Velichov 902., 902a, 902b spojovací kolej +TV	6.-10.,13.-16., 20.-24.	7:30- 16:30	čištění odvodnění	ZP	UNL	
533	73273 D	Cheb zhlaví střední, v části od námezničku výhybky č. 312 po hroty jazyků výhybky č. 312, SK 309. + TV 309., 311.	11.	8:00- 18:00	odstranění původních LIS, zřízení nové BK, doplnění kameniva, zřízení stezek	NVÚ , dodatečný požadavek zhotovitele po dodání materiálu	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

533	73273 E	Cheb zhlaví střední, v části od námezniců výhybky č. 313 po hroty jazyků výhybky č. 313, SK 305. + TV 305., 307.	12.	8:00-18:00	odstranění původních LIS, zřízení nové BK, doplnění kameniva, zřízení stezek	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele po dodání materiálu	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73416 B	Cheb SK 16.,18.,20. + výh. č. 56 + TV SK 6., 18., 20., 22a	18.-N-19.	14:15 -N- 20:00	úprava kolejového lože, doplnění kameniva, výměna pražců, zřízení stezek	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele po dodání materiálu, původně bez výhybky č. 56	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73416 B	Cheb SK 16.,18., 20. + TV SK 6., 18., 20., 22a	18.-N-19.	14:15 -N- 20:00	úprava kolejového lože, doplnění kameniva, výměna pražců, zřízení stezek	NVÚ, dodatečný požadavek zhotovitele po dodání materiálu	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73382 C	Cheb SK 22. v části od návěstidla Se51 po námeznic výhybky č. 55b, SK 22b v části od návěstidla Se52 po námeznic výhybky č. 55a, SK 24. v části od návěstidla Se50 po námeznic výhybky č. 55b, zhlaví směr Tršnice / Františkovy Lázně, v části od námeznic výhybky č. 56 po námeznic výhybky č. 55b (včetně celé výhybky č. 55ab)	20.,21.,22.	07:00-20:00	výměna 2 ks srdcovek, 4 ks opornic, 4 ks jazyků, doplnění kameniva, zřízení stezek	dodatečný požadavek zhotovitele po dodání materiálu (přesun termínu výluk z 9/2023)	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
533	73229 J2	Cheb zhlaví střední, v části od námezniců výhybky č. 31 po námeznic výhybek č. 314, 316 a hroty jazyků výhybky č. 320	23.	08:00-18:00	výměna srdcovky v DKS, výměna jazyka a opornice ve výh. č. 319, doplnění kameniva, výměna pražců	dodatečný požadavek zhotovitele po dodání materiálu	SSZ	ETCS Plzeň (mimo) - Cheb
719	93171 A	Mladotice, SK 5a, část 5. Sk od km 40,300 ke hrotu výh. č. 7, výh. č. 7	6.-N-14.	8:00 -N- 16:00	oprava GPK, SVP		PLZ	
dílčí změny:								
504	73200 P	Teplice záhlaví a část zhlaví bohosudovského od Se4 po nám. výh. č. 3, 4, 5, sudé jen TV	16.	8:00-13:00	propracování koleje (3. podbití), úprava TV	v MPV výl. v ŽST Bohosudov	SSZ	Bohosudov

zrušeno:								
504	73365 A	UL západ výh. č. 148, 152, 158ab	1.	7:00-14:00	cyklické broušení výh. č. 148, 152, 158ab	provede se v rámci doplněných výluk	UNL	
504	73365 B	UL západ výh. č. 159, 161, 165, 168, 169	2.	7:00-15:00	cyklické broušení výh. č. 159, 161, 165, 168, 169	provede se v rámci doplněných výluk	UNL	
504	73365 C	UL západ výh. č. 160, 162, 164, 167	3.	7:00-14:00	cyklické broušení výh. č. 160, 162, 164, 167	provede se v rámci doplněných výluk	UNL	
504	73365 D	UL západ výh. č. 166, 170, 171, 175, 176	13.	7:00-15:00	cyklické broušení výh. č. 166, 170, 171, 175, 176	provede se v rámci doplněných výluk	UNL	
504	73365 E	UL západ výh. č. 177, 180	14.	7:00-12:00	cyklické broušení výh. č. 177, 180	provede se v rámci doplněných výluk	UNL	
504	73327 E	Trmice – Řehlovice 2. TK Trmice záhl. Řehlovice záhl.	31.10./1.11., 1./2.,2./3.	20:00-5:00	broušení kolejnic	změna technologie prací	UNL	
528	63252 A1	P. Stodůlky – P.Waltrovka TK	6. - 10.11.	8:30 - 17:30	údržba silničního nadjezdu	ZP+ND , přesun na prosinec, žádost CPS	CPS	

Schvalovatel 9

měsíc: listopad 2023

datum: 29.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
326	53202 B	Svitavy, zhl. 1. TK směr Opatov od náv. Se24 po náv. L1	9.	8:00-12:00	odstranění defektoskopických vad	nelze od Opatova na lichou skupinu	HKR	
326	33173 D	Svitavy-Březová n. Svit., 1. + TV	7./8.	20:50-4:15	odstranění defektoskopických vad		BNO	
326	33173 B	Letovice, záhl 2.TK směr Březová n. S., jeho část od NV č. 16 po náv. Se20	9./10.	20:30-2:30	výměna LIS u návěstidla Se18		BNO	

dílčí změny:								
326	53202 A1	Č. Třebová - Odb. Zádulka, 1. + TV, Odb. Les - Odb. Zádulka, 3. jen TV	6.	7:00- 15:00	odstranění nežádoucí vegetace a defektoskopických vad	úprava vyloučení TV + přivyloučena kolejově 1. TK, reetapizace původní etapy A, prodloužení času	HKR	
326	53202 A	Č. Třebová - Odb. Zádulka, 1. + TV, Odb. Les - Odb. Zádulka, 3. jen TV	7.	7:00- 13:00	odstranění nežádoucí vegetace a defektoskopických vad	úprava vyloučení TV + přivyloučena kolejově 1. TK	HKR	
zrušeno:								
501	53168 F	Č. Třebová odj. sk. zhl. pražské od náv. Se458 po náv. L33 a L35	9.	7:00- 14:00	odstranění def. vad, navaření srdcovky výh. č. 461	nelze na / z kolejí č. 33 a 35 směr Praha, obsluha kolejí č. S1 až S7, Kalvárie a vl. CZ LOKO pouze s přestavením	HKR	

Změnové tabulky prosinec 2023

Schvalovatel 1

měsíc: prosinec 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
301	23422 L	Havířov SK 12, 14 + TV, SK 16 jen TV	2.-N-5.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – podpěry TV, kanalizace pod SK12, SK14, úprava TV	NVÚ, změna technologie postupu prací s vazbou SSZ a přesun akce na termín 21.11. až 24.11.2023	SSV	HAV
301	23422 M	Havířov SK 18, 20, 22 + TV	2., 3., 4., 5.	8:00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, změna rozsahu s vazbou na změnu pracovních postupů SSZ	SSV	HAV
301	25030 D	Havířov PZS v km 19,521 (P10641)	30.11.-N-1.12.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace souhlasového kabelu	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 C	Havířov SSZ částečné - kolejové obvody staničních kolejí a na albrechtickém zhlaví a záhlaví	25.11.-N-1.12.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kolejových obvodů na albrechtickém zhlaví	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 E	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov TZZ 1. a 2.TK	4.-N-5.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – přepojení kabelizace souhlasového kabelu	Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 E1	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína 1.TK bez TV	5.	8:10-11:10	Optimalizace ŽST Havířov – zkoušení kódování v 1. TK	VNJŘ, Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	25030 E2	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov 2.TK bez TV	5.	11:15-14:15	Optimalizace ŽST Havířov – zkoušení kódování v 2. TK	VNJŘ, Změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23051 B	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína 1.TK+TV	17.	8:00-17:30	kácení stromů	VNJŘ, ND	OVA	
301	23051 E	Havířov SK 1 bez TV, SK 1, 3 jen TV, záhl., zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína	17.	8:00-17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, VNJŘ, ND, přesun realizace zdůvodu změny realizací prací SSZ	SSV	HAV

305	23017 D	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2. TK+TV	11./12.	23:30- 3:30	Pokládka výhybky Odb Jezernice, montáž a úprava TV, přezkoušení odb. komisí.	ZP; na žádost dopravce a SSV přesun výluky na nové ROV (GVD), původně 8/9.12.2023 ROV 23464 B	SSV	BC LiDr
305	25027 A	Lipník nad Bečvou – Drahotuše TZZ 1. a 2. TK, Lipník nad Bečvou SZZ, ETCS, PZZ v km 199,554 (P6492), Drahotuše SZZ	25.11-N-5.12.	8:45-N- 15:00	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice "A" a Odb Jezernice B – doplnění návěstidel, odborná komise, zkoušky TZZ.	VNJŘ+ND; na žádost SSV změna rozsahu, času, termínu a účelu výluky (původně do 30.11.2023, 14:00 hod)	SSV	BC LiDr
305	25027 E	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1.TK bez TV	3.	8:45- 11:45	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice A a Odb Jezernice B přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ; na žádost SSV doplnění výluky (přesun z listopadu - 29.11.2023)	SSV	BC LiDr
305	25027 F	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2.TK bez TV	3.	12:00- 15:00	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice "A" a Odb Jezernice "B" přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ; na žádost SSV doplnění výluky (přesun z listopadu - 29.11.2023)	SSV	BC LiDr
305	25027 G	Lipník nad Bečvou – Drahotuše SZZ aktivace Odb Jezernice A a Odb Jezernice B, Lipník nad Bečvou – Odb Jezernice B – Jezernice A – Drahotuše TZZ AH v 1. a 2. TK	5.	7:00- 15:00	BC LiDr – Aktivace Odb Jezernice A a Odb Jezernice B, přezkoušení funkčnosti TZZ	VNJŘ; na žádost SSV změna rozsahu, času, termínu a účelu výluky – změna postupu prací (původně 30.11.2023, 7:00-14:00 hod.)	SSV	BC LiDr
316	23479 A	Tlumačov ost. zařízení – vyloučení 3. nástupiště	1.-N-5.	8:00-N- 15:00	Demolice výpravní budovy ŽST Tlumačov	Na žádost SPS OVA, odstranění nevyhovujícího objektu, uzavření podchodu na 3. nástupiště	OVA	
316	23479 B	Tlumačov SK 6+TV	1.-N-9.	8:00-N- 23:59	Demolice výpravní budovy ŽST Tlumačov	Na žádost SPS OVA, odstranění nevyhovujícího objektu	OVA	
316	23045 A	Tlumačov SK 6+TV	10.-N-11.	00:00- N-15:00	Demolice výpravní budovy ŽST Tlumačov	Na žádost SPS OVA, odstranění nevyhovujícího objektu	OVA	

dílčí změny:								
301	23422 P	Havířov SK 16, 18 + TV, SK 12, 14, 20, 22 jen TV	6.-N-8.	8:00-N-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – podpěry TV, kanalizace pod SK16, SK18, úprava TV	NVÚ , změna technologie postupu prací s vazbou SSZ a přesun akce z termínu 29.11. až 1.12.2023	SSV	HAV
301	23051 A	Havířov – Ostrava-Bartovice 2. TK+TV	11.-N-15.	8:00-N-15:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů, stavění stožárů, úprava TV	VNJŘ, ND , přesun realizace z důvodu změny realizaci prací s původní termínem 2.12. až 6.12.2023 pod ROV 23469 A	SSV	HAV
301	23024 E	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov 2. TK+TV	19.	7:35-13:00	kácení stromů	VNJŘ, ND , přesun z důvodu prací na stavbě ŽST Havířov (původní termín 11.12.)	OVA	
301	23051 C	Havířov SK 2 bez TV, SK 2, 6, 8, 10 jen TV, záhl., zhl. 2. TK ve směru Ostrava-Bartovice	12., 13.	7:30-17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů, stavění stožárů, úprava TV	VNJŘ, ND, NVÚ , přesun realizace z důvodu změny realizaci prací s původní termínem 3.12. a 4.12.2023 pod ROV 23469 C	SSV	HAV
301	23051 D	Havířov SK 18, 20, 22+ TV	14., 15.	8.00-16:00	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů, stavění stožárů, úprava TV	VNJŘ, ND , přesun realizace z důvodu změny realizaci prací s původní termínem 5.12. a 6.12.2023 pod ROV 23469 D	SSV	HAV
301	23051 B	Havířov – Albrechtice u Českého Těšína 1. TK+TV	16.	8:00-17:30	kácení stromů	VNJŘ, ND , přesun z důvodu prací na stavbě ŽST Havířov (původní termín 8.12. pod ROV 23451 B)	OVA	
301	23051 E	Havířov SK 1 bez TV, SK 1, 3 jen TV, záhl., zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína	16.	8:00-17:30	Optimalizace ŽST Havířov – betonáž základů TV, stavění stožárů, úprava TV	NVÚ, VNJŘ, ND , přesun realizace z důvodu změny realizaci prací s původní termínem 8.12.2023 pod ROV 23469 E	SSV	HAV

301	23051 F	Havířov SK 1, 2, 6, 8 bez TV, SK 1, 3, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 jen TV	17/18., 18/19., 19/20., 20/21.	22:30-04:30	Optimalizace ŽST Havířov – stavba bran, převěšení, úprava TV	LNT, ND, změna technologie postupu prací s vazbou SSZ a přesun akce z původních termínů 10/11., 11/12., 12/13., 13/14.12. (ROV 23023 F)	SSV	HAV
305	23017 C	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1. TK+TV	17/18.,18/19., 19/20.	23:30-3:30	Pokládka odb. větve výhybky, svaření výhybky do BK, montáž TV spojky a regulace TV.	ZP; na žádost dopravce a SSV změna termínů a snížení počtu dnů (původně 15/16.,16/17.,19/20. a 20/21.12.2023)		
zrušeno:								
301	25026 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. ETCS	30.09.-N-09.12.2023	8:00-N-24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Zamítnuto na požadavek MI ŽSR	OVA	
301	25004 A	Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. ETCS	10.12.2023-N-14.12.2024	8:00-N-24:00	vyloučeno ETCS s vazbou na výluky na straně ŽSR	Rušení akce z důvodu legislativy ze strany IM	OVA	
301	23469 B	Havířov SK 1, 3 +TV	2., 7.	9:00-15:00	Optimalizace ŽST Havířov – stavba bran TV č.45-51	NVÚ, ND, změna technologie postupu prací s vazbou SSZ	SSV	HAV
301	23024 G	Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice 1. TK+TV, Ostrava-Kunčice SK 3+TV, záhl., zhl. směr Ostrava-Bartovice od nám. výh. č.88 po náv. 1BS.	13., 14.	7:35-13:00	výměna izolátorů a kotvení směrových lan	NVÚ, VNJR, přesun z důvodu prací na stavbě ŽST Havířov (nově termín 8. a 9.1.2024)	OVA	
301	23024 H	Ostrava-Kunčice SK 3+TV, záhl., zhl. směr Ostrava-Bartovice od nám. výh. č.88 po náv. 1BS. Nelze po 1. TK Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice)	15.	7:35-13:00	výměna izolátorů a kotvení směrových lan	NVÚ, VNJR, přesun z důvodu prací na stavbě ŽST Havířov (nově termín 10.1.2024)	OVA	
301	23024 B	Ostrava-Kunčice – Ostrava-Bartovice 1. TK+TV, Ostrava-Bartovice SK 1 bez TV, lichá jen TV, záhl., zhl. 1. TK směr Ostrava-Kunčice od náv. 1S po nám. výh. č. 20b	19.	7:35-13:00	výměna izolátorů a kotvení směrových lan	NVÚ, VNJR, přesun z důvodu prací na stavbě ŽST Havířov (nově termín 11.1.2024)	OVA	

305	25027 H	Drahotuše: celá bez TV, Drahotuše – Lipník nad Bečvou 1., 2. TK bez TV, Lipník nad Bečvou celá bez TV, Lipník nad Bečvou – Prosenice 1., 2. TK bez TV, Prosenice celá bez TV, CDP Přerov: ost. zař.: SW TK 1 a 2 Lipník n/B – Drahotuše.	1.	0:00-3:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - výměna SW	ZP+ND; na žádost SSV změna termínu – přesun na listopad 2023	SSV	BC LiDr
305	23464 B	Drahotuše – Lipník nad Bečvou 2. TK+TV	8./9.	23:30-3:30	Pokládka výhybky odb., Jezernice, montáž a úprava TV, přezkoušení odb. komisí.	ZP; na žádost dopravce a SSV přesun výluky na nové ROV (GVD) 23017 D	SSV	BC LiDr
305	23017 C	Lipník nad Bečvou – Drahotuše 1. TK+TV	20./21.	23:30-3:30	Pokládka odb. větve výhybky, svaření výhybky do BK, montáž TV spojky a regulace TV.	ZP; na žádost dopravce a SSV změna termínů a snížení počtu dnů (původně 15/16.,16/17.,19/20. a 20/21.12.2023)	SSV	BC LiDr
305	25027 D	Lipník nad Bečvou – Drahotuše TZZ v 1. a 2. TK. částečně od Odb Jezernice "A" po ŽST Drahotuše, Drahotuše SZZ	30.11.-N-5.12.	14:00-N-16:00	BC LiDr – Aktivace odbočky Jezernice "A" - doplnění návěstidel, odborná komise, zkoušky TZZ	VNJR; na žádost SSV zrušení výluky – změna postupu prací	SSV	BC LiDr

Schvalovatel 2

měsíc: **prosinec 2023**

datum: **27.09.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
309	23481 A	Prostějov hl.n.- Vrbátky TK+TV	4., 5.	8:15-17:10	CPS: Stavba - ID46 Prostějov - oprava mostů D46-014..1, 2 - Montáž odvodnění mostu nad TK (km 81,485)	ZP+ND, Dodatečný požadavek CPS pro rekonstrukci mostu nad TK v km 81,485	CPS	
309	23480 A	Olomouc os.n. SK 111 a 113 bez TV, výh. 122	20.11.-N-4.12.	7:00-N-17:00	Výměna kol. roštu (pražce, kolejnice), úprava GPK, oprava povrchu a zřízení AB	požadavek ST Olomouc, odstranění termínovaných závad.	OVA	

309	25029 A	Olomouc – Štěpánov: ETCS	18.9.-N-9.12.	19:30-N-24:00	Odstranění havarijního stavu – výpadek sítě GSM-R	Dodatečný požadavek SSZT Olomouc na odstranění havarijního stavu ETCS – návaznost ROV na nepředpokládanou výluk	OVA	
dílčí změny:								
309	23014 B	Červenka – Moravičany: 2. + TV, Moravičany: sudá + TV, Moravičany – Mohelnice: 2. + TV	18.,19.	8:10-18:00	Údržba TV, ÚPP, stavba stožárů, vystrojení UO, kotvení ZV a opravné práce na SK/TK.	VNJŘ ; koordinace prací, navýšení rozsahu vyloučení a účelu výluk	OVA	
309	23014 C	Červenka – Moravičany: 2. + TV, Moravičany: sudá + TV, Moravičany – Mohelnice: 2. + TV	20.	8:10-13:00	Demontáž základu TP 6, údržba TV, ÚPP a opravné práce na SK/TK.	VNJŘ ; koordinace prací, navýšení rozsahu vyloučení a účelu výluk	OVA	
zrušeno:								
311	23431 A	Zábřeh na Moravě – Postřelmov TK + TV	27.11.-N-1.12.	8:30-N-19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů km 4,355 (P6654) a 4,569 (P6655), - silniční uzávěra	ZP+ND ; na žádost SSZT OLC přesun na rok 2024 - změna postupu prací	OVA	
311	23431 B	Zábřeh na Moravě – Postřelmov: zab. zař.: PZS - (P6654) v km 4,355, (P6655) v km 4,569	27.11.-N-6.12.	8:30-N-19:00	Doplnění závor a oprava vozovky přejezdů km 4,355 (P6654) a 4,569 (P6655)	na žádost SSZT OLC přesun na rok 2024 - změna postupu prací	OVA	

Schvalovatel 3

měsíc: **prosinec 2023**

datum: **27.09.2023**

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
317	35003 A	Strážnice – Sudoměřice nad Moravou TZZ, PZS km 11,557 (P8146), PZS km 11,981 (P8147)	11.-N-15.	8:00-N-14:00	aktivace PZS v km 11,557 (P8146), oprava PZS v km 11,981 (P8147)	přes PZS v km 11,981 (P8147) jízdy na Op	BNO	
317	35003 B	Strážnice SZZ částečně – vazby PZS km 11,577 (P8147) do odjezdových návěstidel	11.-N-15.	8:00-N-14:00	aktivace PZS v km 11,557 (P8146), oprava PZS v km 11,981 (P8147)		BNO	

317	35003 C	Sudoměřice nad Mor. SZZ částečně – vazby PZS km 11,577 (P8147) do odjezdových návěstidel	11.-N-15.	8:00-N- 14:00	aktivace PZS v km 11,557 (P8146), oprava PZS v km 11,981 (P8147)		BNO	
318	35027 A	Hodonín – Mutěnice TZZ TK	4.-N-8.	7:00-N- 14:00	úpravy zabezpečovacího zařízení pro VDS		BNO	
318	35027 B	Mutěnice SZZ	4.-N-8.	7:00-N- 14:00	úpravy zabezpečovacího zařízení pro VDS		BNO	
318	35027 C	Mutěnice – Čejč TZZ TK	4.-N-8.	7:00-N- 14:00	úpravy zabezpečovacího zařízení pro VDS		BNO	
318	35027 D	Čejč SZZ	4.-N-8.	7:00-N- 14:00	úpravy zabezpečovacího zařízení pro VDS		BNO	
318	35027 E	Čejč – Kobylí na Moravě TZZ TK	4.-N-8.	7:00-N- 14:00	úpravy zabezpečovacího zařízení pro VDS		BNO	
318	35027 F	Kobylí na Moravě SZZ	4.-N-8.	7:00-N- 14:00	úpravy zabezpečovacího zařízení pro VDS		BNO	
320	33180 G	Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK bez TV, Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK jen TV část od ÚO 421 v km 11,233 do km 74,086	7.11-N-9.12.	16:00-N- 24:00	modernizační práce na straně ŽSR	místo etapy D, snížen rozsah vypnutí napájení TV	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
320	33244 B	Břeclav výh. č. 97	1.	7:30- 17:30	nutné navaření srdcovky výh. č. 97, odstranění defektoskopických vad		BNO	
320	33244 A	Šakvice záhl. a zhl. 2. TK směr Zaječí část od náv. Se9 po nám. výh. č. 6, SK 2 bez TV část nám. výh. č. 6 po náv. S2	9.	7:10- 13:35	nutná výměna LIS mezi výh. č. 5 a 7	VNJŘ ovlivnění 2. TK Zaječí-Šakvice	BNO	
320	33008 A	Vranovice – Šakvice 1. TK bez TV	17./18.	19:30- 4:30	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň
324	33240 A	Brno-Maloměřice St.3 záhl. 1. TK směr Brno-Královo Pole, Brno-K. Pole – Brno-Maloměřice 1. TK bez TV	3./4.	19:40- 4:45	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň

324	33240 B	Brno-Královo Pole záhl. 1. TK směr Brno-Maloměřice	3./4.	19:40- 4:45	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň
324	33240 C	Brno-Královo Pole záhl. 1. TK směr Brno-Maloměřice, Brno-K.Pole – Brno-Maloměřice St.3 1. TK bez TV	4./5.	19:40- 1:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 D	Brno-Královo Pole SK 1 bez TV část od náv. L1 po nám. výh. č. 5, záhl., zhl. SK 1 směr Brno-Maloměřice část od nám. výh. č. 5 po náv. Se3	4./5.	20:50- 1:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 E	Brno-Maloměřice St.3 - Brno-K.Pole 2. TK bez TV, Brno-Královo Pole záhl. 2. TK směr Brno-Maloměřice	5.	1:00-4:45	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 F	Brno-Maloměřice SK 2d bez TV	5.	1:00-4:45	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 E1	Brno-Maloměřice St.3 - Brno-K.Pole 2. TK bez TV, Brno-Královo Pole záhl. 2. TK směr Brno-Maloměřice	5.	19:40- 24:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 F1	Brno-Maloměřice SK 2d bez TV	5.	19:40- 24:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 G	Brno-Královo Pole záhl., zhl. 2. TK směr Brno-Maloměřice část od náv. Se2 po nám. výh. č. 6	5.	22:00- 24:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33240 H	Brno-Královo Pole záhlaví 2. TK směr Kuřim, Brno-K.Pole – Kuřim 2. TK bez TV	6.	0:00-5:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
324	33174 B1	Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru 2. TK+TV	1.,4.	7:40- 15:20	údržba trakčního vedení	nutná údržba trakčního vedení	BNO	
507	35002 A	Havl. Brod – Ždírec nad Doubr. DOZ, Havlíčkův Brod – Humpolec DOZ	10.	0:00-2:00	aktivace zab. zař. DOZZ	jízdy na Op	BNO	

dílčí změny:								
320	33001 A	Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK bez TV, 1. TK jen TV část od ÚO 421 km 11,233 do km 74,086	10.12.2023 -N- 30.6.2024	0:00-N- 16:00	modernizační práce na straně ŽSR	změna def. vyloučeného zařízení (snížen rozsah vypnutí napájení TV)	ŽSR	Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.
zrušeno:								
320	33180 D	Lanžhot – Lanžhot st. hr. 1. TK+TV	25.10. -N- 9.12.	16:45-N- 23:59	modernizační práce	změna termínu ukončení - nově do 7.11.2023 do 16:00 hod., nahrazeno etapou G	SSV + ŽSR	Lanžhot – Lanžhot st.hr., Devínská Nová Ves – Kúty št.hr.

Schvalovatel 4

měsíc: prosinec 2023

datum: 29.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
501	50018 A	Pardubice hl. n. kolejově 95. spojovací kolej	13.11.-N- 2.12	9:00-N- 18:00	oprava kolejové váhy	dodatečné finanční prostředky	HKR	
dílčí změny:								
501	55003 A	Pardubice hl. n. SSZ	10.-N-19.	00:00- 18:00	přepínání SZZ	změna termínu, (původně zadáno 10.12.-N-2.5.) Bezprostředně navazuje na výluky podle ROV 55041 etapa A (JŘ 2022/2023). Po ukončení výluky budou změny zaneseny do ZDD.	SSV	stavba Pardubice
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 5

měsíc: prosinec 2023

datum: 20.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno								
516	33195 A	Ledeč n/S-Vlastějovice TK	1.	7:10-13:50	výměna DVK, údržba ŽS, výřez vegetace	ZT+ND, nezajištění ND 20.10	BNO	
521	63180 F7	P.Z.Město-P.Krč TK+TV	1.	18:30-24:00	skládka kolejnic	ZP	SSZ	Branický most
521	63180 K7	P.Krč 8. SK+TV 4.-10. SK	1.	18:30-24:00	skládka kolejnic	LNT (souběh s etapou O)	SSZ	Branický most
523	63180 E3	P.Krč-P.Vršovice TK+TV	1., 4.-8.	8:30-18:30	stavba TZ	ZP+ND	SSZ	Branický most
523	63180 O/ 63008 O	P.Krč 2. SK+TV 1., 1a, 1b, 2., 3. SK	-N-20.12.	-N-17:30	stavba kabelovodu	NVÚ	SSZ	Branický most
525	65003 A	P. Malešice - P. Běchovice ETCS 1., 2. TK, P. Libeň - P. Malešice ETCS TK, P. Malešice ETCS, P. Malešice - ZM ETCS 1., 2. TK, P. Malešice - P. Hostivař ETCS TK	10.12.-N-30.4.	0:00-N-18:00	budování nového ETCS po úpravě ZZ v Praze Malešicích	pokračování ROV 65013 G	SSZ	ETCS Malešice
526	63264 B	P.Bubny holeš. zhlaví od jazyků výh. č. 114, 115 po hroty jazyků výh. č. 121, 120+napětí TV 16. SK a holešovického zhlaví	4./5.,5./6.	20:30-4:30	montáž svršku	ZP, odklony trs P.Holešovice	PHA	
704	63268 C	Olbramovice-Votice vč. 105	2.	8:00-15:40	odstranění def. vad	ND, nelze jezdit Červený Újezd-Votice 2. TK (pouze 1 hrana)	PHA	
704	63268 B	Olbramovice-Votice vč. 110, 111	3.	8:00-15:40	navazování srdcovek	ND, nelze jezdit Olbramovice-Červený Újezd 1. TK (pouze 1 hrana)	PHA	
704	63268 A	Olbramovice výh. č. 19	4.	7:10-15:10	odstranění def. vad	nelze suda od Benešova	PHA	
704	63268 D	Olbramovice-Votice vč. 112	5.	7:40-15:40	odstranění def. vad	nelze jezdit 92.spojovací kolej	PHA	
dílčí změny:								
524	63161 S8	P.H.Počernice-Mstětice 1. TK+TV, P.H.Poč. mstětické záhlaví a zhlaví od náv 1L k náv. L1, L3	9.	12:00-18:00	dmt vložené izolace	souběh s etapami K, L, v tabulce nad rámec RPV uvedeno 8.12.2023	SSZ	Vysočany-Mstětice

zrušeno:								
521	63180 D,P/ 63008 A,P	odb.Záv.-odb.Tunel 3., 4. TK+TV, odb.Tunel-P.Krč TK+TV, P.Krč TV celá	-N-31.12.	0:00-N- 24:00	zdvoukolejnění tratě, oprava mostu v km 9,680	ZP, posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
521	63180 F/ 63008 B	P.Krč-P.Z.Město TK+TV	-N-31.12.	6:00-N- 24:00	budování odb. Spořilov a zastávky Kačerov	ZP, posun zahájení investiční akce	SSZ	Branický most
523	63180 L	P.Krč branické záhlaví a zhlaví od náv. L po nv.č. 2, náv. S1, S4, S6	-N-1.12.	7:30-N- 17:30	TSO křížení 901	ZP+ND, posun zahájení investiční akce	PHA	
523	63180 M	P.Krč 1a SK	-N-1.12.	7:30-N- 17:30	TSO křížení 901	posun zahájení investiční akce	PHA	

Schvalovatel 6

měsíc: prosinec 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
521	63263 B1	Beroun – Karlštejn 1. TK + TV	2.-9.	8:30- 18:30	terénní úpravy	VNJR+ND	SSZ	BERKA
708	93160 A	Prachatice – Chroboly TK, Prachatice lázně celá dopravna	7.11.-N-6.12.	8:00-N- 16:00	celková výměna kolejových roštů se strojním čištěním a zřizováním BK v obloucích malých poloměrů, výměny přejezdových konstrukcí, odstranění zavedených PJ	ZP+ND	PLZ	
710	93173 A1	Běšiny – Klatovy TK	30.11./1.12	20:25- 4:30	snesení podschržení silničního mostu "Silnice I/27 - přeložka Klatovy"	ZP	CPS	
710	93173 A	Běšiny – Klatovy TK	1.-N-2.	20:25-N- 13:30	snesení podschržení silničního mostu "Silnice I/27 - přeložka Klatovy"	ZP+ND	CPS	
710	93173 A2	Běšiny – Klatovy TK	2.-N-3.	20:25-N- 7:25	snesení podschržení silničního mostu "Silnice I/27 - přeložka Klatovy"	ZP	CPS	

dílčí změny:								
708	93160 C	Zbytiny – Volary TK	4.,5.	9:20-14:35	údržba průjezdného průřezu, úprava rozhledových poměrů u železničních přejezdů, kácení stromů.	ZP+ND původně 11. a 12.12.2023 dle ROV 93005 B, v souběhu s ROV 93160 A	PLZ	
711	93166 A	Dobřany – Chlumčany u D. TK + TV, Chlumčany u D. celá doprava + TV, Chlumčany u D. - Přeštice TK + TV, Přeštice celá doprava + TV, Přeštice – Švihov u Klatov TK + TV, Švihov u Klatov celá doprava + TV Švihov u Klatov – Klatovy TK + TV	20.11.-N-1.12.	8:25-N-16:10	úprava TV – zrušení dočasného neutrálního pole v km 51,100 - 51,250, geoprůzkum	ZP+ND zkrácení výluky kvůli posunu výluk dle ROV 63263 B1, původně ve dnech 20.11. - 4.12.2023	CPS SSZ	
zrušeno:								
707	93161 A	Černý Kříž – Nové Údolí TK, Nové Údolí celá doprava	6.	8:15-13:20	údržba průjezdného průřezu, kácení stromů	ZP+ND zrušeno kvůli doplnění nepřetržité výluky dle ROV 93160 A	PLZ	
708	93160 A	Prachatice – Chroboly TK, Prachatice lázně celá doprava	4.,5.,	7:35-14:30	údržba průjezdného průřezu, úprava rozhledových poměrů u železničních přejezdů, kácení stromů	ZP+ND re etapizace, nahrazeno nepřetržitou výlukou	PLZ	
708	93005 A	Chroboly – Zbytiny TK, Chroboly záhlaví směr Zbytiny, Zbytiny záhlaví směr Chroboly	13.,14.,15.	9:25-14:40	údržba průjezdného průřezu, úprava rozhledových poměrů u železničních přejezdů, kácení stromů	ZP+ND přesun do listopadu	PLZ	

Schvalovatel 7

měsíc: prosinec 2023

datum: 27.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
503	63092 C1	Dřísy 1. + 3. SK, TV lichá	4.,5.,6.,7.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun z listopadu NVÚ	PHA	

503	63092 E1	Všetaty – Dřísy 1. TK + TV	4.,5.,6.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun z listopadu	PHA	
503	63092 B1	St. Boleslav – Dřísy 2. + TV	8., 9.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun z listopadu	PHA	
503	63092 G1	Dřísy zhl. směr St. Bol.	8., 9.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun z listopadu	PHA	
503	63092 D1	Dřísy 2. + 4., TV sudá	8., 9.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun z listopadu NVÚ	PHA	
503	63092 A1	Dřísy - St. Boleslav 1. + TV	7.	7:30 – 17:30	dmt TZ, TP	přesun z listopadu	PHA	
503	73226 A1	V. Žernoseky – Litoměřice 1. TK+TV	30.11./1.12	23:35-4:35	sypání štěrku, výstavba TP, převěšení a regulace TV	ZP	SSZ	Litoměřice – Žernoseky
503	73323 A	Děčín východ 2. SK + TV	27.11.-N-1.12.	7:00-N-17:00	odstranění blátivých míst, výměna pražců, strojní úprava GPK	původně v termínu 6.-10.11. kapacitní důvody NVÚ	UNL	
503	73414 A	Děčín hl.n. 114. SK	27.11.-N-6.12.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve 114. SK	dodatečný přiděl finančních prostředků	UNL	
510	55045 A	Smidary: PZM v km 39,672 (P4453)	4.-N-8.	8:00-N-12:00	rekonstrukce PZZ	1x Op	SSV	
527	73395 B	UL sever 213. SK + výh. č. 212, 222	4.-N-8.	7:00-N-17:00	výměna pražců ve výh. č. 212 a 222	dodatečný přiděl financí	UNL	
546	75022 A	Č. Kamenice – Mlýny TZZ, PZS v km 26,817 (P2611) a PZM v km 27,393 (P2612), v km 27,777 (P2613) a v km 28,624 (P2614)	4.-N-8.	8:00-N-15:00	vypnutí PZS, výměna technologie PZS, zapnutí a přezkoušení nového PZS	přesun z listopadu z důvodu průtahů při zajišťování podkladů pro stavební povolení	UNL	
546	75022 B	Benešov n. Pl. - Markvartice TZZ a PZS v km 13,141 (P2586)	6.	8:00-17:00	vypnutí PZS, demontáž a výměna závorových stojanů PZS, zapnutí a přezkoušení nového PZS	přesun z listopadu z důvodu průtahů při zajišťování podkladů pro stavební povolení	UNL	
547	53220 A	Liberec – Mníšek U Liberce TK + obě záhlaví	4.,5.	8:30 - 16:30	kácení a výřez porostu strojně	ZP+ND	HKR	
547	53220 B	Mníšek u Liberce – Raspenava TK + obě záhlaví	6.	8:30 - 16:30	kácení a výřez porostu strojně	ZP+ND	HKR	
547	53220 C	Raspenava – Frýdlant v Čechách TK + obě záhlaví	7., 8.	8:10 - 16:10	kácení a výřez porostu strojně	ZP+ND	HKR	
547	53017 A	Raspenava – Frýdlant v Čechách TK + obě záhlaví	11.	8:10 - 16:10	kácení a výřez porostu strojně	ZP+ND	HKR	

547	53017 B	Frýdlant v Čechách – Višňová TK + obě záhlaví	12., 13.,	8:00 - 16:00	kácení a výřez porostu strojně	ZP+ND	HKR	
547	53017 C	Višňová – Černousy TK + záhlaví směr Višňová v dopravně Černousy	14., 15.	8:00 - 16:00	kácení a výřez porostu strojně	ZP+ND	HKR	
dílčí změny:								
527	73005 B	UL hl.n. jih – UL západ 2. TK	14.	8:00-15:00	broušení kolejnic do profilu AHC	původně 13.12.2023 posun mimo souběh s doplněnou výlukou 73018 A+B	UNL	
539	73337 A	Čížkovice – Libochovice TK	1., 2.	7:00-17:30	strojní podbíjení styků, odstranění porostu	ZP+ND, původně v termínu 14.-16.11. kapacitní důvody sekačky	UNL	
zrušeno:								
0								

Schvalovatel 8
měsíc: prosinec 2023
datum: 02.10.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, dopravna	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	výluka pro	název stavby
doplněno:								
504	73018 B	UL západ 3b, 5b,9a SK jen TV po ÚO 408 a ÚD 10	11.,12.,13.	8:00-16:00	výměna pražců ve výh. č. 103 a ve spojce výh. č. 103 a 111a	LNT nutná oprava před akcí SS - rekonstrukce mostu v km 3,040	UNL	
504	73415 A	UL západ výh. č. 804, 805, 806, 808, 810	4.	8:00-16:00	cyklické broušení výh. č. 804, 805, 806, 808, 810		UNL	
504	72D32011	Řehlovice – Trmice 1. TK+TV Řehlovice ústecké záhl. od náv 1L po náv. Se1	11.-N-15.	7:00-N-19:00	SVK, výměna KL v P2079, úprava GPK	původně v termínu 4.-N-8. 9. (zamítnuta uzavírka přejezdu)	UNL	
504	73418 E	Řehlovice 1. SK	2./3.	20:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73418 D	Ohníč – Světec 2. TK Ohníč záhl. Světec záhl.	1./2.	20:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	

504	73421 A	Bílina 1. SK zhl. zlatnické od náv. L1 po náv. Se17	8.	19:00- 23:59	broušení kolejnic	souběh s etapou B	UNL	
504	73421 B	Odb Č. Zlatníky – Bílina 1. TK Odb Č. Zlatníky záhl. Bílina záhl.	8./9.	19:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73421 B1	Odb Č. Zlatníky – Bílina 1. TK Odb Č. Zlatníky záhl. Bílina záhl.	9.	19:00- 23:59	broušení kolejnic	konec GVD 2022/2023 nově jako ROV 73023 A do 5:00 hod	UNL	
504	73023 A1	Odb Č. Zlatníky – Bílina 1. TK Odb Č. Zlatníky záhl. Bílina záhl.	10.	00:00-5:00	broušení kolejnic	navazuje na ROV 73421 C (přechod na GVD 2023/2024)	UNL	
504	73023 A	Odb Č. Zlatníky – Bílina 1. TK Odb Č. Zlatníky záhl. Bílina záhl.	10./11., 11./12., 12./13.	19:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73023 B	Odb Č. Zlatníky 1. SK + zhl. bílinské	13.	00:00-5:00	broušení kolejnic	ovlivnění 1. TK Odb Č. Zlatníky – Bílina	UNL	
504	73023 C	Bílina zhl. zlatnické mezi náv. Se16 – Se19	13.	19:00- 21:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73023 D	Bílina – Odb Č. Zlatníky 2. TK Bílina záhl. Odb Č. Zlatníky záhl.	13./14.	19:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73023 D1	Bílina – Odb Č. Zlatníky 2. TK Bílina záhl. Odb Č. Zlatníky záhl.	14./15.	19:00-1:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73023 E	Odb Č. Zlatníky – Most 2. TK Most záhl.	15.,16.	1:00-5:00	broušení kolejnic		UNL	
504	72A33250	Bílina -Odb. Č. Zlatníky 0. TK	15./16.	19:00-1:00	broušení kolejnic		UNL	
504	73393 A	Kyjice – Odb Dolní Rybník: 1., 2. jen TV	2.,3.	8:20-17:10	montáž optokabelu s bezp. prvky pro letový provoz	LNT+ND dodatečný požadavek po zrušení výluk 6., 7.8.2023 (ROV 73241 A, A1) z důvodu závady stožáru linky VN	CPS	
528	63252 A1	P.- Stodůlky - P.-Waltrovka TK	4. - 8.12.	8:30 - 17:30	údržba silničního nadjezdu	ZP+ND , přesun z listopadu, žádost CPS	CPS	

531	73417 G	Droužkovice – Chomutov TK	30.11./1.12	22:35-5:45	broušení kolejnic	ZP	UNL	
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
504	72A32121	Řehlovice – Úpořiny 2. TK+TV	11.-13.	8:00-14:00	odstranění porostu, kácení stromů	přesun kapacit, nový termín 8.-10.1.2024	UNL	
504	72C32327	Úpořiny – Ohníč 2. TK+TV Úpořiny 2.,4. SK jen TV, záhl. a zhl.	14.,15.	7:30-14:00	odstranění porostu, kácení stromů	NVÚ, nevhodný souběh s doplněnou výlukou dle ROV B 72D32011	UNL	

Schvalovatel 9

měsíc: prosinec 2023

datum: 29.09.2023

VR	ROV	vyloučený úsek, doprava	datum	čas	účel	poznámka, důvod změny	vyluka pro	název stavby
doplněno:								
326	33006 A	Skalice n. Svit.-Rájec-Jestřebí, 1. bez TV, Rájec-Jestřebí záhl. 1. TK směr Skalice n. Svit.	11./12.	19:30-2:00	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň
326	33006 B	Skalice n. Svit., záhl. 1. TK směr Rájec-Jestřebí	11./12.	19:30-2:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 C	Skalice n. Svit., 1. bez TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Rájec-Jestřebí, její část od náv. S1 po náv. Se3	11./12.	22:00-2:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 D	Letovice-Skalice n. Svit., 1. bez TV, Skalice n. Svit., záhl.1. TK směr Letovice	12.	2:00-5:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 E	Letovice, záhl.1. TK směr Skalice n. S.	12.	2:00-5:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 D1	Letovice-Skalice n. Svit., 1. bez TV, Skalice n. Svit., záhl. 1. TK směr Letovice	15.	0:00-3:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 E1	Letovice, záhl.1. TK směr Skalice n. S.	15.	0:00-3:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň

326	33006 F	Rájec-Jestřebí, záhl.2. TK směr Skalice n.Svit., Rájec-Jestřebí-Skalice n. S., 2. bez TV	12./13.	19:30-4:50	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň
326	33006 G	Skalice n. Svit., záhl. 2.TK směr Rájec-Jestřebí	12./13.	19:30-4:50	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 H	Skalice n. Svit., 2. bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Rájec-Jestřebí, jeho část od náv. Se4 po náv. S2	13.	2:00-4:50	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 I	Skalice n. S., záhl. 2.TK směr Letovice, Skalice n. Svit.-Letovice, 2. bez TV	14.	0:30-4:45	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 J	Letovice, záhl. 2. TK směr Skalice n. S.	14.	0:30-4:45	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 K	Letovice-Březová n. Svit., 2. bez TV	14.	0:00-0:30	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 L	Březová n. Svit., záhl.2. TK směr Svitavy, Březová n. Svit.-Svitavy, 2. bez TV	13.	20:05-0:00	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň
326	33006 L1	Březová n. Svit., záhl.2.TK směr Svitavy, Březová n. Svit.-Svitavy, 2. bez TV	13.	3:30-5:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 M	Březová n. Svit.-Letovice, 1. bez TV	14.	23:30-0:00	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 M1	Březová n. Svit.-Letovice, 1. bez TV	15.	3:00-3:30	broušení kolejnic		BNO	brousící kampaň
326	33006 N	Svitavy-Březová n. Svit., 1. bez TV	14.	20:05-23:30	broušení kolejnic	VNJŘ	BNO	brousící kampaň
dílčí změny:								
0								
zrušeno:								
309	53004 A	Třebovice v Č.-Č.Třebová, 4. bez TV, Třebovice v Č., záhl. 4. TK směr Č. Třebová vj.sk., jeho část od náv. Se13 po náv. TS, Č.Třebová vj.sk., záhl. 4. TK směr Třebovice v Č., jeho část od náv. TL po náv. Se104	14.	02:00-06:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	

309	53004 B	Č.Třebová odj.sk.-Třebovice v Č., 200. bez TV, Č.Třebová odj.sk, záhl. 200. TK od náv. Se405 po náv. 200L, Třebovice v Č., záhl. 200. TK směr Odb. Les, jeho část od náv. ZS po náv. Se10	13./14.	20:00-02:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 A	Ústí n.O.-D.Třebová, 1. bez TV, Ústí n.O., 1a bez TV, její část od náv. Lc1a po náv. S1a, záhl. 1. TK směr D. Třebová, jeho část od náv. S1a po náv.1L, D.Třebová, záhl. 1. TK směr Ústí n. O., jeho část od náv. 1S po náv. Se5.	11./12.	20:00-01:30	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 B	Ústí n.O., 1.,1b,1c,1d bez TV, 1b SK její části od náv. Lc1b po náv. Sc1b, 1c SK její část od hrotu výh.č. 7 po náv. Lc1b, 1d SK její část od náv. Se14 po hrot výh. č. 27, výh. č., 27, 7	12.	01:30-05:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 C	D.Třebová – Ústí n.O., 2. bez TV, D.Třebová, záhl. 2. TK směr Ústí n. O., jeho část od náv. Se6 po náv. 2S. Ústí n.O., záhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, Ústí n.O., zhl. 2. TK směr D.Třebová, jeho část od hrotu výh.č. 1 po LIS v km 255,470 (mezi výh. 1 a 4), Ústí n.O., 2a bez TV	12./13.	20:00-01:30	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 D	Ústí n.O., 2.,2b,2c bez TV, 2. SK, její část od NV č. 8 po náv. L2, zhl. 2. TK směr D.Třebová, jeho část od HV č. 4 po LIS v km 255,470 (mezi výh.č. 4 a 1), Ústí n.O., výh. č. 8	13.	01:30-05:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	

501	53005 E	Č.Třebová - Odb. Parník, 2. bez TV, Č.Třebová, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 14 a 16 od náv. 2S po náv. L14 a L16	14./15.	19:00-05:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 F	Odb. Parník - D.Třebová, 2. bez TV, Odb. Parník, část 2. TK od náv. 2L po náv. 2S	15.	02:00-05:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 G	Odb. Parník - Č.Třebová, 1. bez TV, Č.Třebová, záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník včetně části SK č. 1 a 5 od náv. OS po náv. L1 a L5	15./16.	19:00-05:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	
501	53005 H	D.Třebová - Odb. Parník, 1. bez TV, Odb. Parník, část 1. TK od náv. 1L po náv. 1S	16.	02:00-05:00	broušení kolejnic brousícím vlakem	kapacity zhotovitele (přesun na leden)	HKR	

Červeně – výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.

Modře – výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě



Europaprogramm: Rail Freight-Korridore 7/8 **Evropský program: Rail Freight-Koridory 7/8**


Änderungen der Dispositionsbereiche in der Betriebszentrale Leipzig
Změny dispečerských oblastí v dispečerské centrále v Lipsku



01.11.2023






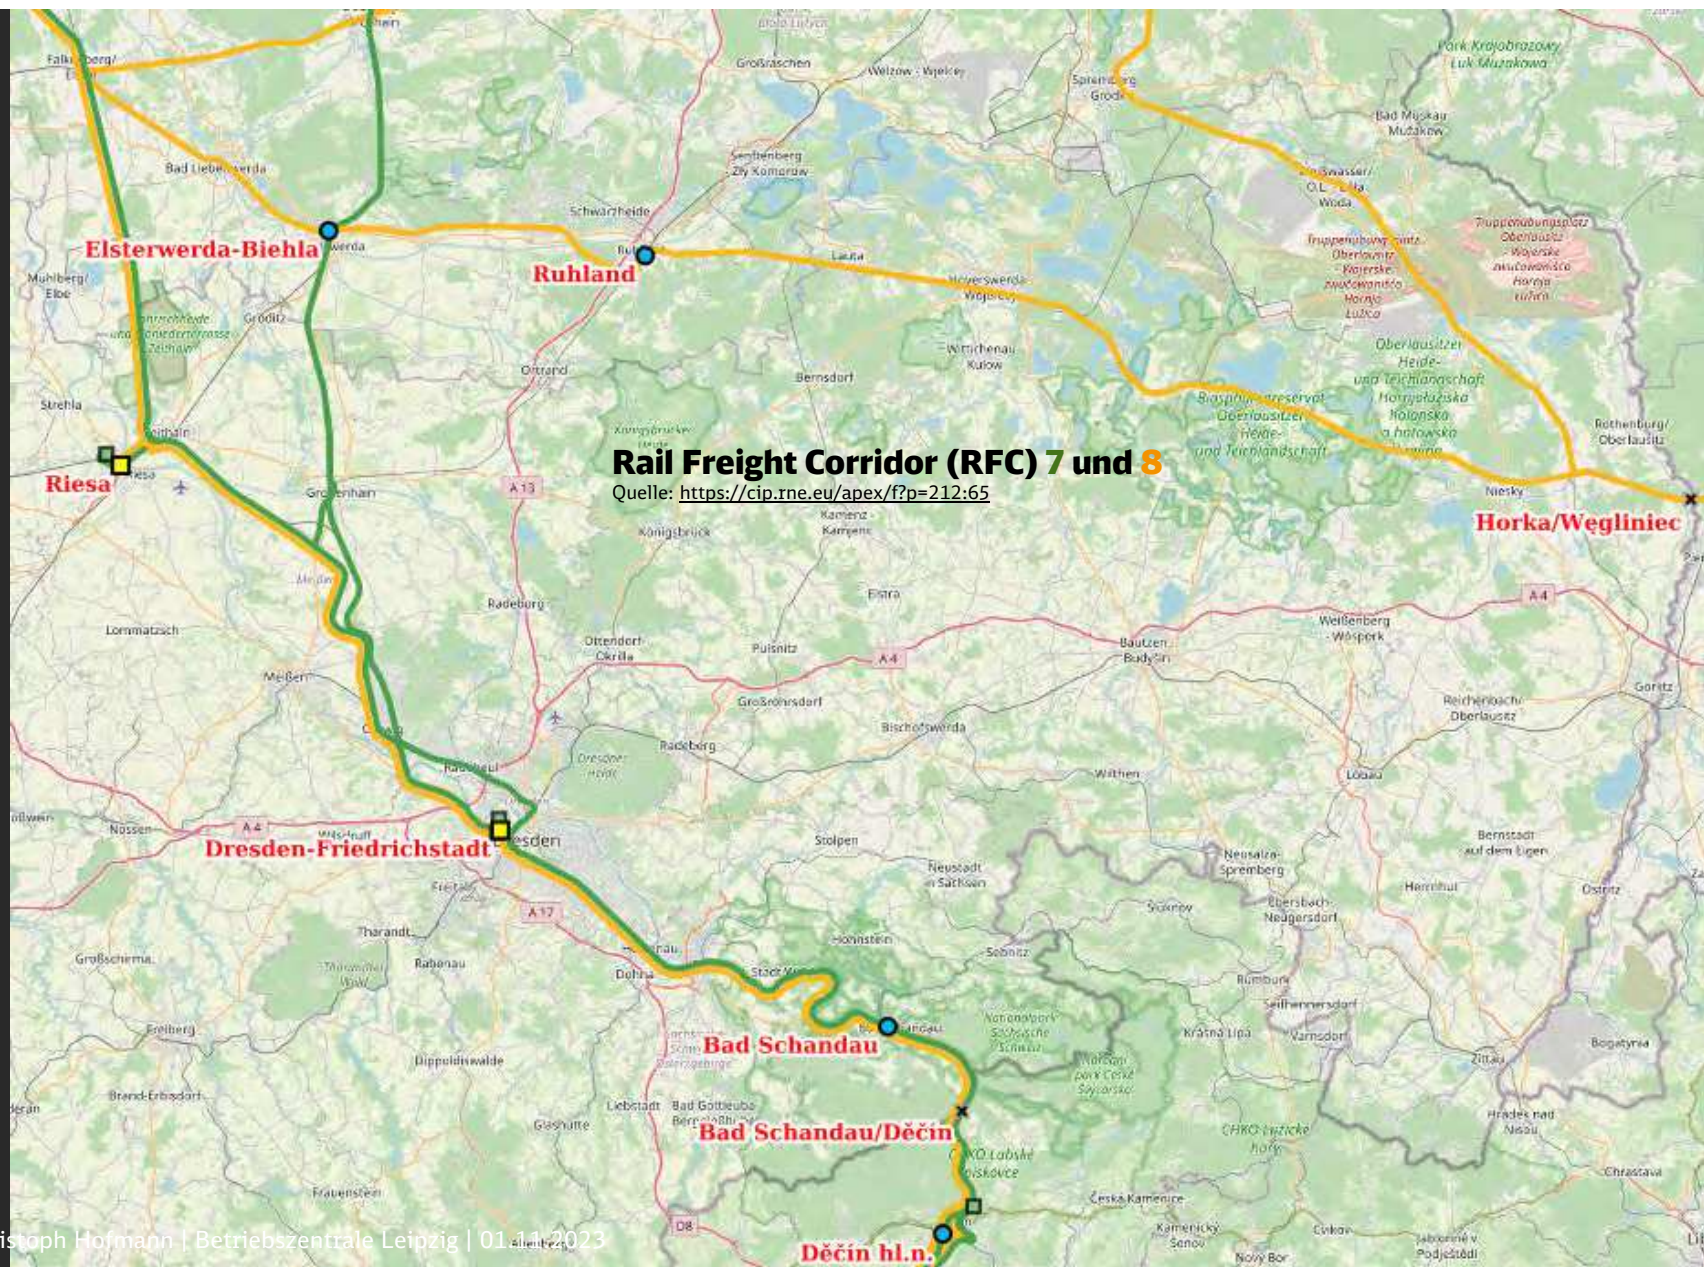

Der unmittelbare Grenzverkehr wird ab 01.11.23 durch den RFC-Disponenten betreut.



Od 01.11.23 bude přímý přeshraniční provoz zpracovávat dispečer RFC.

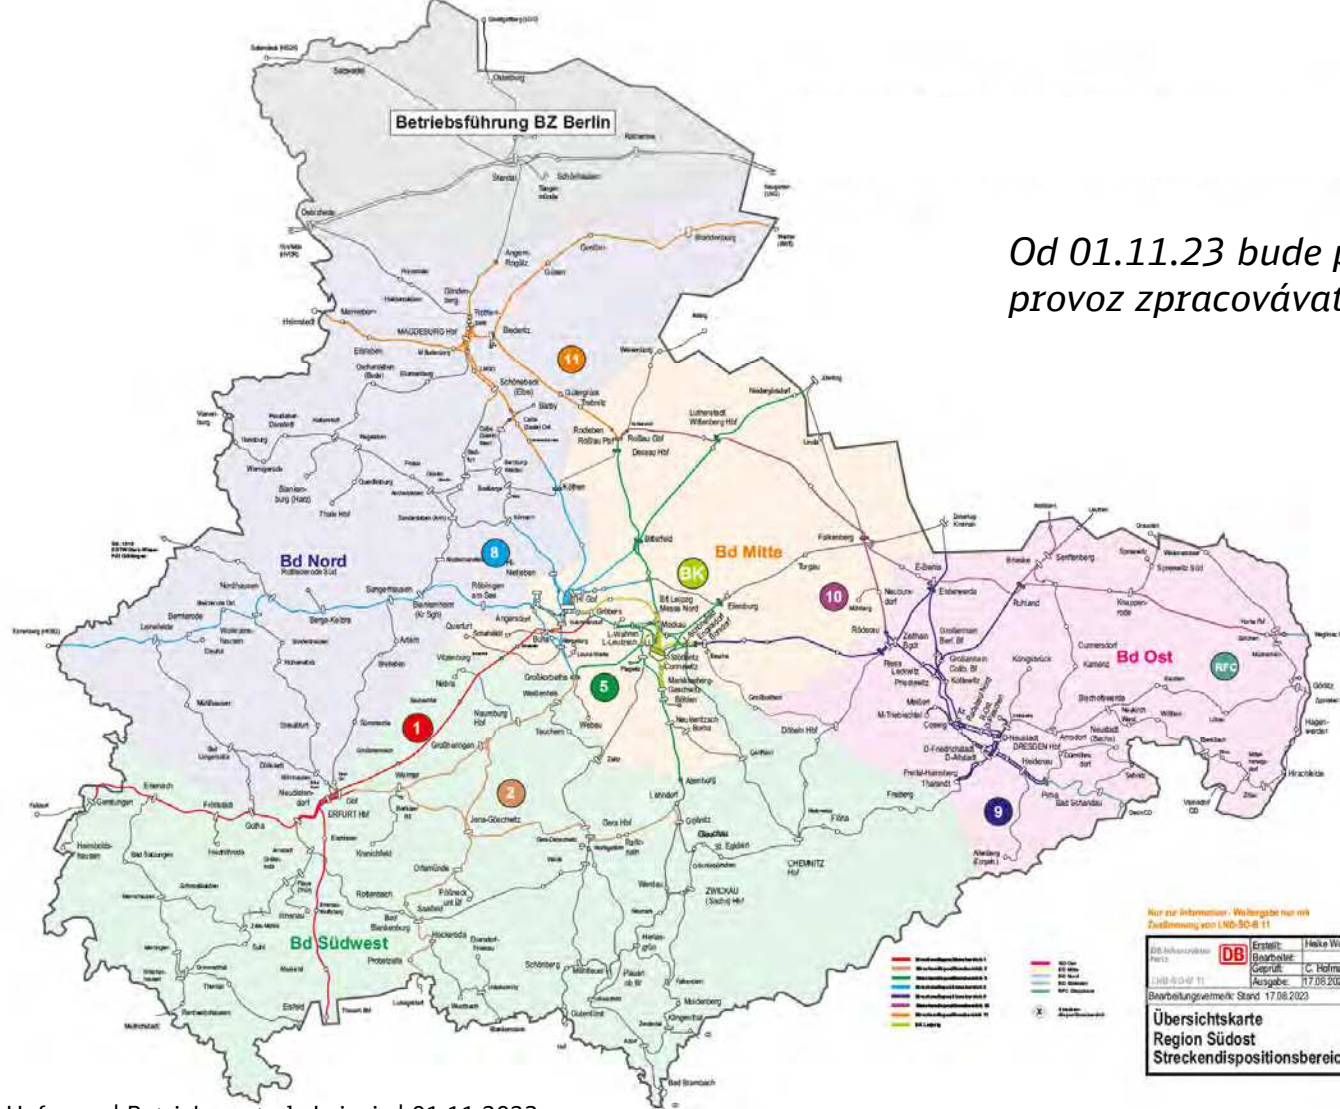


Der BK Dresden wird umbenannt in Zugdisponent 9 und erhält einen geänderten Zuständigkeitsbereich.

Oblastní koordinátor Dresden bude přejmenován na vlakového dispečera 9 a dostane jinou oblast odpovědnosti.

Neu wird der Zugdisponent 10 eröffnet.

Bude zahájena nová funkce vlakového dispečera 10.

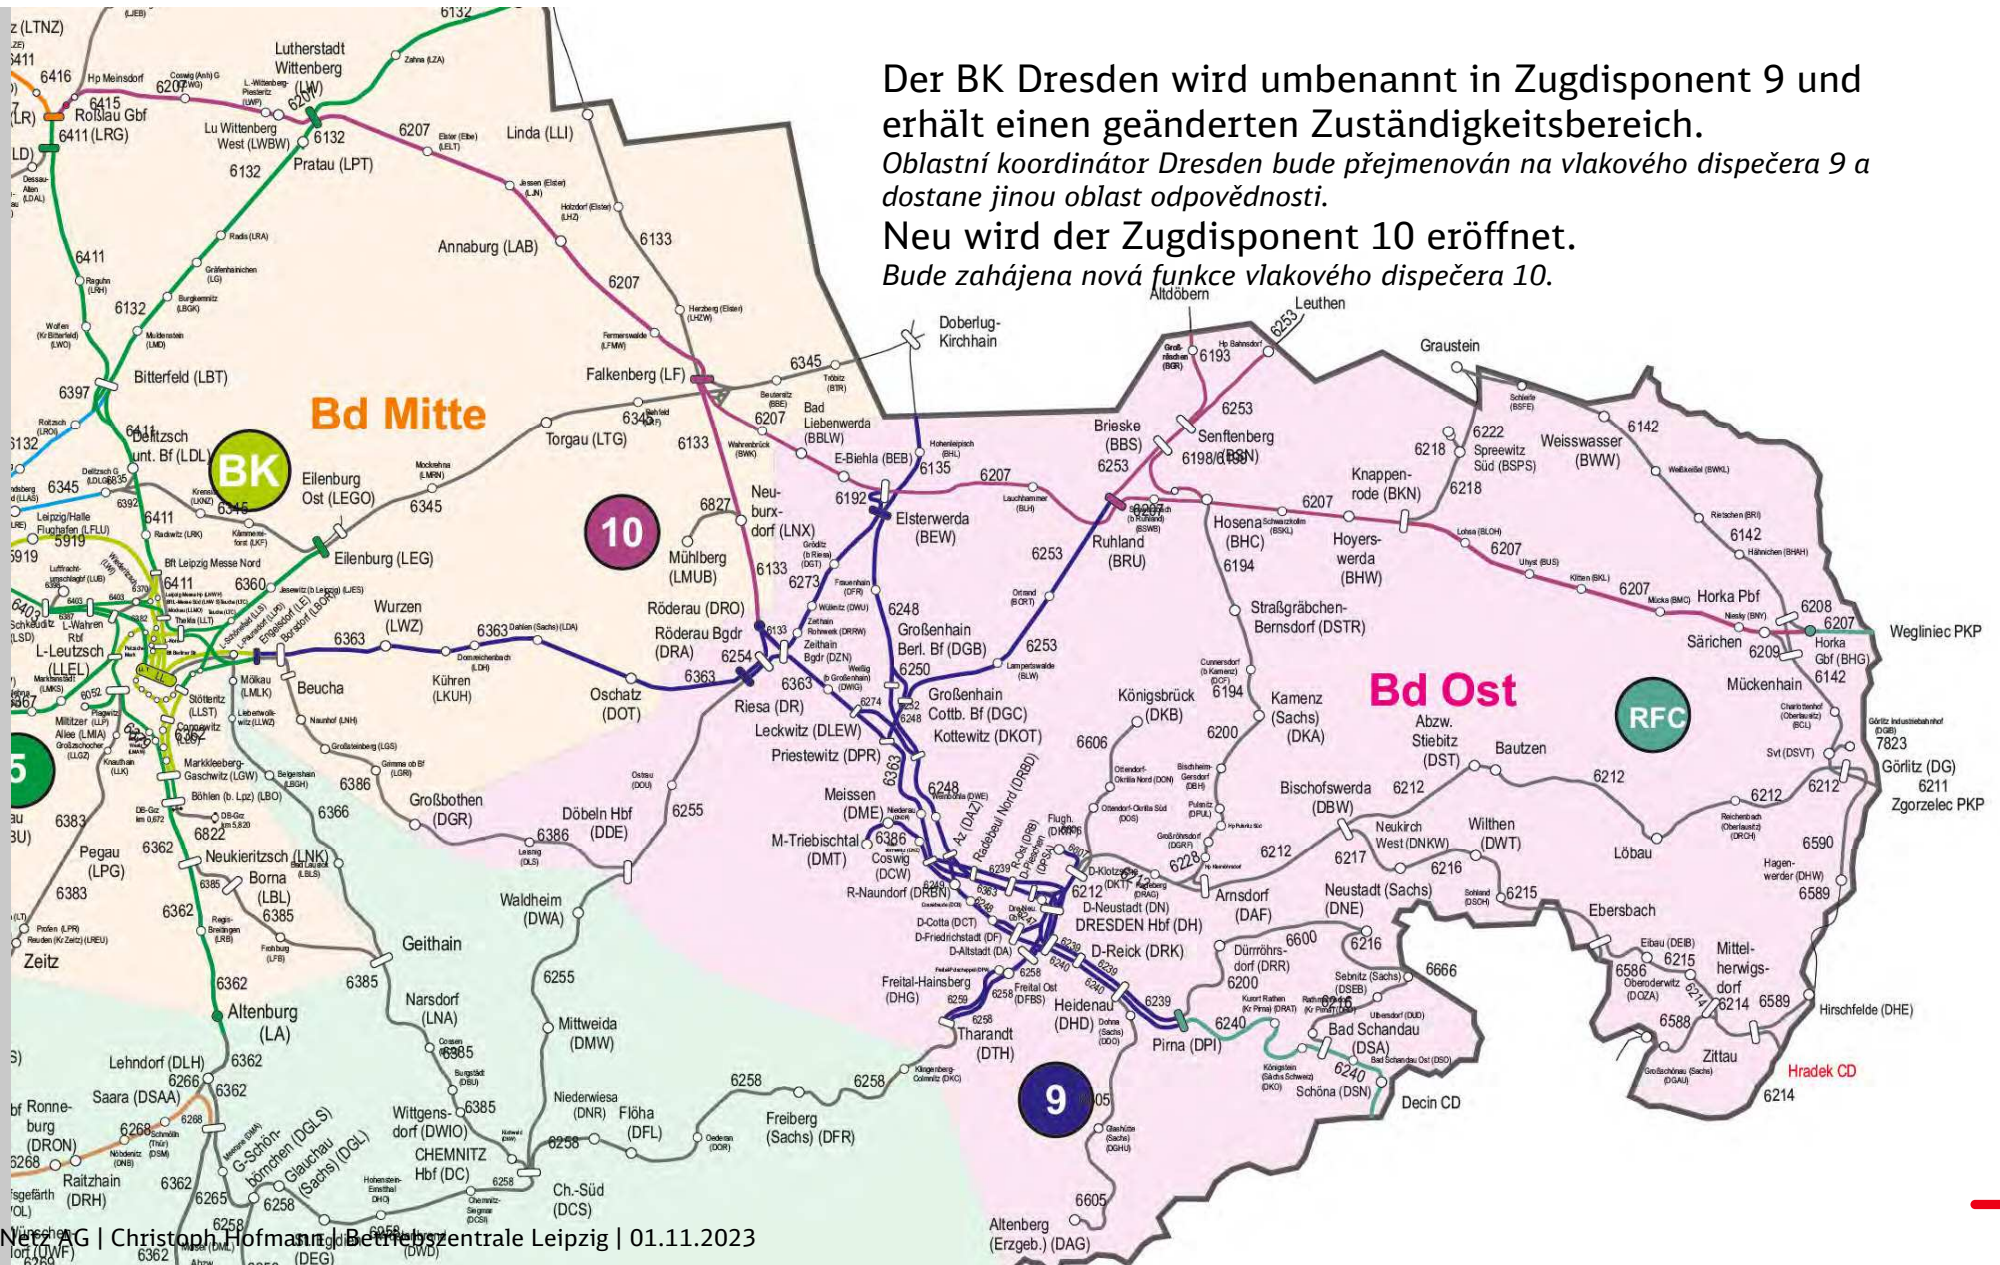

Aufgabenbeschreibung RFC7/8-Disponent – Auszug

Popis úlohy RFC7/8 Dispečer - úryvek




- Aufgaben Zug- und Bereichsdisposition in zugeordneten Bereichen Horka Gbf - Wegliniec und Pirna Gbf - Schöna Gr für alle Verkehre → dies schließt die zugscharfe Annahme und Weigerung von Zügen an beiden Grenzübergängen ein
Úkoly Vlakový a oblastní dispečink v přidělených oblastech Horka Gbf - Wegliniec a Pirna Gbf - Schöna Gr pro veškerou dopravu. To zahrnuje přijímání a odmítání vlaků na obou hraničních přechodech.
- Betreuung, Beachtung, Zu- und Ablaufsteuerung aller internationalen Güterverkehre für Schöna Gr und Horka Gbf in Abstimmung mit Bereichsdisponenten oder Zugdisponenten (weisungsbefugt in Bezug auf die Reihenfolge von Güterzügen im Zulauf auf die beiden Grenzen), incl. Kenntnis der für den Grenzverkehr bedeutsamen abgestellten Züge in der Region.
Dohled, pozornost, řízení příjezdu a odjezdu veškeré mezinárodní nákladní dopravy pro Schöna Gr a Horka Gbf v koordinaci s oblastními dispečery nebo vlakovými dispečery (oprávněnými vydávat pokyny týkající se sledu nákladních vlaků přijíždějících k oběma hranicím), včetně znalosti odstavených vlaků v regionu, které jsou důležité pro příhraniční dopravu.
- Abstimmung Grenzverkehre (Horka und Schöna) mit benachbarten Infrastrukturbetreibern (auch: Unterstützung bei anderen regionalen Grenzübergängen, insbesondere im Umleitungsfall); Übernahme sämtlicher weiterer Kommunikation mit PKP und SZ
Koordinace přeshraniční dopravy přeprav (Horka a Schöna) se sousedními provozovateli infrastruktury (také: podpora na ostatních regionálních hraničních přechodech, zejména v případě odklonu); převzetí veškeré další komunikace s PKP a SZ.
- Abstimmungen zu grenzüberschreitenden Trassen mit den beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen (z.B. Zugnummernwechsel, Tfz- oder Tf-Wechsel, Abstellungen im grenznahen Raum)
Odsouhlasování přeshraničních tras s příslušnými dopravci (např. změna vlakových čísel, změny hnacích vozidel a strojvedoucích, odstavování v příhraniční oblasti)

Neue Erreichbarkeiten

Nové kontaktní údaje

Zd 9 neu (24/7)	0341-968- 6709	LBZ.BZ-Zd9@deutschebahn.com
Zd10 neu (24/7)	0341-968- 6710	LBZ.BZ-Zd10@deutschebahn.com
RFC7/8 (24/7)	0341-968- 6899	LBZ.BZ-RFC@deutschebahn.com
Teamleiter RFC (Bürodienst) <i>Vedoucí týmu RFC</i> <i>(služba v kanceláři)</i>	0152-37431272	Sebastian.Hammer@deutschebahn.com

 Der RFC-Disponent erhält die Telefonnummer des heutigen BK Dresden, aber eine neue Mailadresse!
Dispečer RFC obdrží telefonní číslo dnešního BK Drážďany, ale novou mailovou!

An aerial photograph of Hamburg, Germany, taken during the golden hour of sunset. The city's skyline is visible, featuring numerous buildings, a prominent church spire, and a large harbor area with many cranes. A river flows through the city center. Overlaid on the image is the logo for DB NETZE, consisting of a red rounded rectangle containing the letters 'DB' in white, followed by the word 'NETZE' in large, white, sans-serif capital letters.

DB NETZE

Projednání měsíčních výlukových plánů 11/2023, 12/2023, 1/2024
Porada

Datum konání 27.09.2023

Čas 10.00 – 13.00

Místo konání Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1, 2. patro, zasedací místnost č. 232

Jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
TOMÁŠ ROLNÍK	SŽ OR	725 982 179	rolnik@spravazeleznic.cz	
YIARÍ STEHLÍK	SŽ O12	942 424 202	stehlik@spravazeleznic.cz	
PETR HAJNÍŠ	SŽ OR UNL	942 424 285	HAJNIS@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
TOMÁŠ MORAVKA	SŽ-SSZ	702 204 093	MORAVKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Alena Visková	SŽ-OR	942 424 103	viskova@spravazeleznic.cz	
VLADIMÍR ZELINKA	SŽ OR UNL	942 424 514	ZELINKA.V@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
Ivona Šlosková	SŽ OR	602 650 634	slaskova@spravazeleznic.cz	
KAMIL KROVÍL	SŽ OR OVA	724 862 490	krovilko@spravazeleznic.cz	
JIRÍ GLOS	SŽ OR OVA	702 210 496	glosj@spravazeleznic.cz	
František Novák	SŽ O15	607 252 262	novak.fr@spravazeleznic.cz	
Josef Valach	SŽ-SSV	724 932 377	valach.j@spravazeleznic.cz	
Dušan Janků	SŽ-C10	724 007 406	anku.d@spravazeleznic.cz	
Petr Vévoda	SŽ O15	602 172 663	vevoda@spravazeleznic.cz	
Petr WENICKA	C10 Praha	702 292 252	WENICKA.P@spravazeleznic.cz	
ZIŘKA HRADNICKÁ	SŽ-O15	602 384 408	HRADNICKA.Z@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Macha	SŽ OR DMO	942 626 099	MACHA@spravazeleznic.cz	
Libuše Mokříš	SŽ O-12	604 040 263	MOKRIS@spravazeleznic.cz	
Jaroslav Kmoníček	SŽ-OR HKR	720 972 248	KMONICEK@spravazeleznic.cz	

Svým podpisem souhlasím s případným pořízením fotodokumentace z jednání pro další zpracování za účelem splnění podmínek poskytovatelů dotace a propagaci SŽ.

jméno a příjmení	firma/útvár	telefon	e-mail	podpis
Jana Kolářová	SZ-012	725 813 405	Kolarkova@sprava.zelaznic.cz	
Michal Krěmčík	SZ-CE PLZ	425 440 496	KRECKI@SPRAVA.ZELAZNIC.CZ	
Erika Sychrová	SZ-OR PLZ	972 122 221	Sychrova@sprava.zelaznic.cz	
Tomáš Holář	SZ-SSZ	722 143 103	HOLAR@SPRAVA.ZELAZNIC.CZ	
Lukáš Kalousek	SZ-ORPHA	657 013 012	Kalouseklu@sprava.zelaznic.cz	
Petr Kuník	SZ-GE OR	725 805 707	kunik@sprava.zelaznic.cz	
Josef Hájek	SZ-GE OK	725 813 510	hajec@sprava.zelaznic.cz	
Helena Kopsypalová	MIR s.r.o.	402 149 841	KOFSYPALOVA@METRANSIC.BE	
Jiří Buzovský	ČD Cargo	725 708 985	jiri.buzovsky@cdcargo.cz	
Jaroslav Týle	ŽESNAD.CZ	602 530 462	office@zesnad.cz	
Petr Horávek	SVOD BOHEMIA	602 726 726	INFOP@SVODBOHEMIE.CZ	
Ondřej Štěpán	CS ORS	702 197 040	STEPANO@CS.CZ	
Richard Palach	PKPCI	604 456 783	richard.palach@pacargointernational.com	
Vít Kocmánek	KORDIS JMK	703 858 305	vkocmanek@kordis-jmk.cz	
Martin Zahradka	ISPK	722 450 063	ZAHRAKA.MARTIN@ISPK.CZ	
Jan Roženský	ROPID	723 408 798	rozenky.jan@ropid.cz	
Pavolav Valenta	ROPID	720 947 869	VALONTA.PAVOLAV@ROPID.CZ	
Oldřich Pěnička	CERSK	774 365 100	oldrich.penicka@cernargo.eu	
Stanislav Novák	SZ-012	602 667 824	NovakS@sprava.zelaznic.cz	
